


N&T的自工序研讨

3T指预计开标时间、预计下单时间，要求到货时间。

N指产品清单。

1. 背景

需求计划是供应链管理的核心工作，以此指导物料采购、产能规划与生产排程。其中在0-3个月与4-6个月需求计划制定都会参考销售漏斗。销售漏斗的准确性，对供应链管理有看重要的影响。

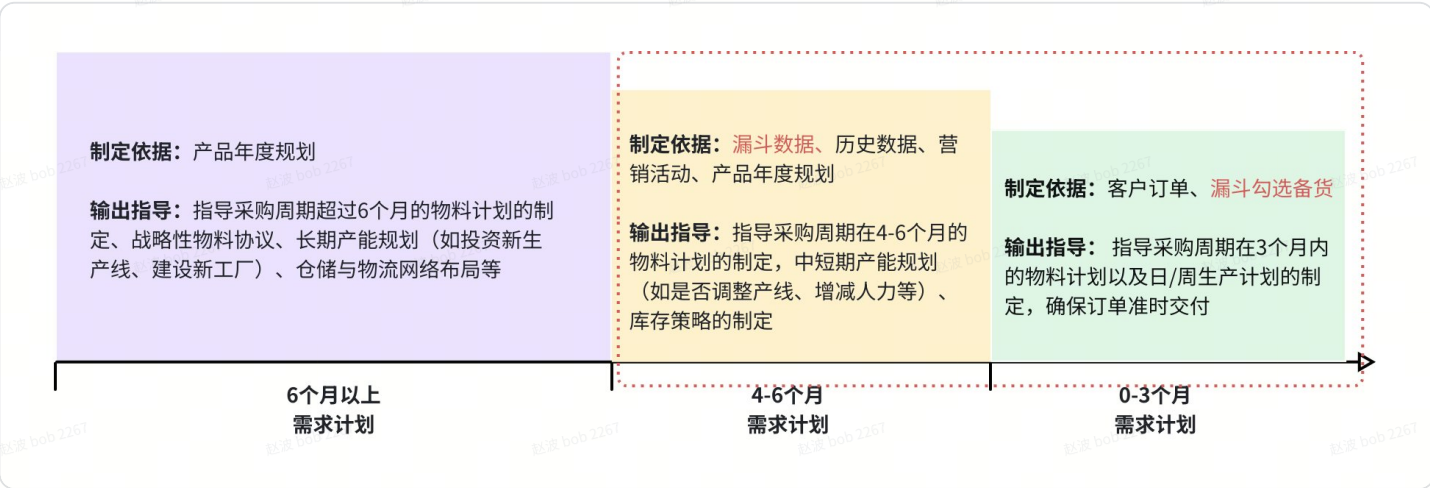

由于销售漏斗的“N”及“T”不准确，会导致需求计划的源头出现错误，对EBG经营利润造成影响


分类	不质量行为	影响
N不准	下单项目清单准确率低：2025年1-7月，当月72%、提前1个月57%、提前2个月45%	①导致呆滞料和库存的产生：因报备不准导致2个月成品库存高（2025年1-7月2个月成品库存为6725万，未达成≤5375万的目标）
T不准	- 下单时间准确率低：2025年1-7月，当月92%、提前1个月62%、提前2个月30% - 下单项目要货时间准确率低：2025年1-7月，当月45%、提前1个月30%、提前2个月21%	②客期变更率、急单率高（25年1-7月有15%订单下单后调整客期，急单率高达56%，客期提前/急单存在交付风险，针对急单的提拉需求，供应链需要投入额外的成本，客期延后影响库存周转）

2. 通过自工序提升漏斗NT质量

基于如上背景，育辉启动了**漏斗清单**（N：型号和数量）和**时间**（T：开标时间、下单时间、要货时间）做准的质量专项：

分类	现状	问题	根因分析
N	①售前根据客户需求在配置器里配置清单，存在根据历史项目产品清单简单调整，只匹配上总金额就提交到漏斗中 ②销售既可以使用从配置器分享的配置清单，也可以自己在ECP系统里使用历史存留的产品报价清单，简单调整，只要匹配上总金额就提交到漏斗中 ③针对售前销售提交的产品清单进漏斗时，没有检查校验环节，只看有无，不看质量。项目推进过程中N发生变化时，未及时更新	N存在不质量的导入方式，没有人对清单的准确性负责	①关于清单的准确性，缺乏评价标准 ②清单准确性责任人不明确 ③进漏斗后的商机发生变化后没有及时更新清单的信息的要求和标准
T	①业务机会从漏斗外进漏斗内时，销售只填预计开标时间、预计下单时间即可，要货时间可写可不写，出现很多空缺。 ②销售对预计开标时间、预计下单时间、要货时间的填写非常的随意，有的人靠经验和感觉，有的拍脑袋定时间，填上去就算完成了。项目推进过程中T发生变化时，未及时更新。 ③代理商下单时填写的要货时间，和销售在漏斗中填写的要货时间分没有关联。而且口径不一致，订单是发货口径，漏斗是到货口径。	T(开标时间、下单时间、要货时间)存在不质量的情况，没有人对T的准确性负责 漏斗要货时间和代理商填写的要货时间未做系统关联，口径未对齐。	①针对漏斗外进漏斗内的业务机会，缺失对要货的管理； ②缺乏统一的时间判断标准及对应的质量要求。 ③缺失要货时间的约束规则，缺失CRM和CES系统之间的IT能力。

进现场后发现**核心问题**在于：销售在项目清单和时间的填写是**很随意的**，**意识薄弱**且**没有方法**判断到底什么样算做准。育辉通过导入**自工序完结设计方法**，针对项目从**漏斗外进漏斗内**以及各个**关键节点**设计**N和T自工序质量标准**

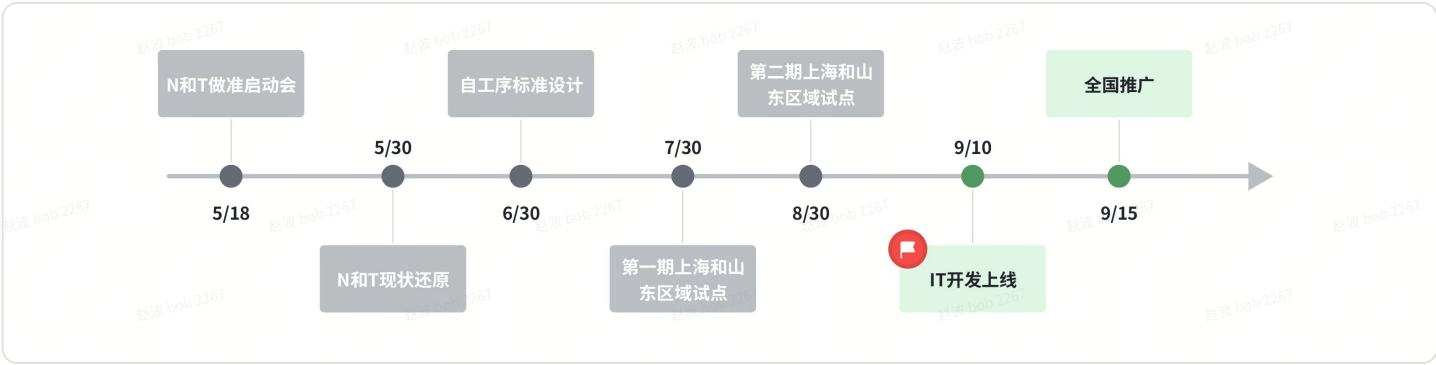

2.1 N的自工序

N的质量提升标准指导书： 国提升漏斗质量--项目进漏斗时及进漏斗后对“N”的要求--区域试点

- ①**明确N的责任人：**售前是N的唯一责任人，销售必须通过售前分享的清单才能录入系统中。
- ②**建立N的质量标准：**可信度自评打分标准。

可信度自评打分标准

打分类别	序号	打分项	自评打分	自评打分依据	权重	打分结果	核查依据
项目预算	1	预算金额	3	5分--我司相关预算，采购规则、历史采购价格及竞手价格策略确认。 4分--我司相关预算明确。 3分--项目整体预算确认，我司相关预算可估算。 0分--其它。	20%	0.6	以销售判断为准
技术路线	2	产品系列	3	5分--所有产品系列均可以确定； 4分--产品系列80%以上可以确定； 3分--产品系列50%以上可以确定； 0分--其它。	20%	0.6	5分：技术路线已写进招标文件。 4分：决策者已经确定技术路线。 3分：我司主推技术路线已经明确。 注：产品系列的定义以配置器为准。
	3	产品型号	3	5分--所有产品型号均可以确定； 4分--产品型号80%以上可以确定； 3分--产品型号50%以上可以确定； 0分--其它。	30%	0.9	5分：产品技术参数已写进招标文件。 4分：评估者已经确定产品技术要求。 3分：我司主推产品型号已经明确。
性能容量	4	产品数量	3	5分--所有产品数量均确定； 4分--产品数量80%以上可以确定； 3分--产品数量50%以上可以确定； 0分--其它。	30%	0.9	5分：产品数量已写进招标文件。 4分：评估者已经确定产品数量。 3分：我司已经评估出产品数量。
自评可信度合计得分						60.00%	

③建立项目进漏斗内的管理机制：项目漏斗外转转内或直接新建漏斗内项目时，需要符合评分标准，否则不允许转漏斗。

④建立业务机会推进过程管理标准：根据项目不同的预测类别，有最低的清单准确度要求，当预测类别发生变化时，清单可信度要及时提升。

配置清单可信度要求

进漏斗时	进漏斗时售前根据“可信度自评打分标准”对产品清单做可信度自评，当“ 预算金额 ”和“ 产品系列 ”两项均不低于3分时，才可以把产品清单分享销售。销售导入售前分享的清单后提交漏斗申请。			
进漏斗后	漏斗内项目不同预测类别/距离开标天数对清单可信度要求			
	预测类别/时间	可能-	可能+	优势
	可信度	24%	60%	80%
	距离开标30内	弱电/ICT项目65% 其它项目100%	弱电/ICT项目65% 其它项目100%	弱电/ICT项目65% 其它项目100%

2.2 T的自工序

T的质量提升标准指导书： 销售漏斗业务机会 “3T” （要求到货时间、预计下单日期、预计开标日期） 指导书

①统一了3T判断标准及对应的质量要求

3T的判断标准和质量要求		Ruijie锐捷 Networks	
序号	3T	判断（质量）标准	质量把控
1	要求到货时间	针对财政资金/标准政采项目、弱电&EPC总包项目、ICT&投融资项目、中大企业集采框架OC子项目、金融行业框架OC子项目等所有项目均以最终设备使用或者上线时间来倒推“预计要货时间”，主要考虑了如下两种情况： - 不需要大量施工布线的项目：最终设备使用和上线时间至少倒推15天来确定预计要货时间； - 涉及到大量的施工布线的项目：最终设备使用和上线时间往前倒推30天来确定预计要货时间； 如上为建议时间是跟根据项目施工复杂程度来的，重点还是需要销售要提前跟客户/渠道沟通好最终设备使用或者上线时间以及施工周期在系统及时更新好“预计要货时间”，需要特殊支持的务必提前跟供应链对应的同事保持沟通。	销售填写“要求到货时间”，并且根据“预计要货时间”的判断说明在“备货说明”里面填写清楚要货时间根据（销售易CRM里面的位置以及相关示意如下）；“备货说明”不填写清楚的情况，“要求到货日期”是无法填写的； - “备货说明”填写示范： （1）不需要大量施工布线的项目按照最终设备使用和上线时间至少倒推15天来填写“要求到货时间”，填写范本：与客户端信息办主任确认，项目预计9月30日最终上线，且项目不涉及大量的施工布线，按照上线15天也就是9月15日填写“要求到货时间”，并且与王主任确认，这个要求到货时间是可以满足的； （2）涉及到大量的施工布线的项目：最终设备使用和上线时间往前倒推30天来确定预计要货时间，填写范本：与现场实施的项目经理王经理确认，项目预计9月30日最终上线，因项目涉及到大量的布线工作，按照上线30天也就是9月1日填写“要求到货时间”，并且与王经理确认，这个要求到货时间是可以满足的； （3）流水或者紧急项目（含翻盘项目等），根据项目的实际情况填写“要求到货日期”，同时，要与供应链的同事保持密切沟通，做相关到货的协调；
2	预计下单时间	针对财政资金/标准政采项目、弱电&EPC总包项目、ICT&投融资项目、中大企业集采框架OC子项目、金融行业框架OC子项目等所有项目的“预计下单时间”均以“预计要货时间”-“订单SLA”来做依据； - 一个订单里面如果涉及多款产品，每款产品SLA不同，最终订单的SLA是取大值，比如A 3天，B 7天，C 14天，那么订单的SLA是14天；	确保到销售执行：跟据预计要货时间以及订单的SLA来设置预计下单时间的底线范围；（目前销售填写的预计下单日期在SLA测算出来之后的，视为质量OK）
3	预计开标时间	针对“预计开标日期”以“正推法”和“倒推法”，重点以正推法作为指导（试点过程中的复盘，销售基本都在用“正推法”和“倒推法”，沟通充分的情况下，盘点基本ok）	项目在申请进入漏斗内的时候，需要销售参考“预计开标时间”的判断标准，填写清楚“预计开标日期填写依据”（销售易CRM里面的位置以及相关示意如下），系统会做设置，如果该字段未填写，系统无法提交漏斗内的申请，漏斗内申请成功之后，区域经理需要针对“预计开标日期填写依据”做核对，没问题才可以审批同意进入漏斗内； - “预计开标日期填写依据”填写示范： （1）如果已经发标的项目，填写范本如下：项目已经发出标书，招标文件里面写的投标时间是7月20日，与信息办主任沟通，项目计划在7月25日评标，并且当天能出结果，所以预计开标时间填写7月25日； （2）如果项目还没有发标，重点依据“正推法”或者“倒推法”里面的： - 例如按照“正推法”的填写范本如下：该项目的客户是2025年6月中旬正在进行方案评估工作，与信息办主任确认他们还要进行测试和样板考察，这大概需要1个半月的时间，时间就到了8月初；然后信息办确定方案和最终预算，要上院办会评审报批，院办会每2周一次，顺利排上过会需要至少2周时间，时间就到了8月中旬；方案预算过了之后，信息中心需要起草招标文件这需要1周时间，然后报国资处审核又需要至少2周时间，这就到了9月上旬；然后国资处会整理好招标文件报招标公司，招标公司排队2周时间发标，预计发标日期就到了9月底；按照该客户以往的项目看，发标后大概率有人质疑，21天肯定开了不标，预计开标日期可能在9月30日，所以以开标日期写9月30日；（范本里面内容是假设，大家参考这个格式按照实际情况来填写，并且随着项目的推进及时的修订项目的预计开标时间） - 例如按照“倒推法”的填写范本如下：项目前期规划要在2025年10月底竣工验收，根据目前与客户谁准（或者渠道谁准）安装实施测试至少1个月的时间，那么客户到货日期就在9月30日左右；从下完单发货到客户收货，估计要持续至少2周时间，那预计下单日期就在9月15日左右；项目属于财政招标项目，客户中完标就要货，中标渠道与客户签订合同加上各级渠道的下单商务流程至少需要1周时间，那中标渠道与客户合同签订日期就要在9月8日左右；中标渠道签客户合同需要1周时间，预计拿到中标通知书的时间在9月1日左右；中标公示7天，那预计开标日期就应该在8月24日左右；（每一个节点都应该找到相关人员做过核实的） - 如果是30万以下流水且不招标项目，可以简化填写，填写范本如下：与上海**渠道采购经理王**确认，合同以及7月30日能完成签约，考虑到之前跟他们公司签约合同总会拖几天，所以综合考虑因素往后推出5天，所以预计开标日期写8月30日；

②将要货时间作为业务机会进漏斗后的必填项（此前为可选项），并明确填写依据。

销售机会

可能

591,079.32

2026-03-13

编辑

创建报价单 (E...)

新建

分批备货

到期修改

本次主管盘点记录批注

上次销售自盘记录

上次主管盘点记录批注

项目属性

业务类型

招标项目（非弱电/ICT类）

项目状态标记

项目成功分类

Upside

细分市场

企业网高联教-普通本科

应用场合

网络改造

是否新建

否

是否地市

否

地市名称

是否ICT(运营商类项目)

否

是否成功设计极简光

否

商机来源

最终用户同步

ICT类客户

上传附件

补充信息

是否分批采购

否

二级部门/大区/BG

中国南区平台管理部

锐捷区域

上海

国内/国际

国内

备货信息

是否需要备货

①

要求到货日期

①

备货说明

①

不备货原因/约货原因

①

不含锁光

①

否

清单已确认

否

清单确认日期

大项目管理

认领人

无

大项目级别

①

无法判断要货日期的，需要填写不备货原因，原因直接选填

系统信息


3. N、T自工序落地情况

3.1 NT自工序目标

指标分类	指标名称	提前期	25年平均	目标	
				第一阶段 26年6月	最终目标
N	下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	当月（M-0）	73%	85%	95%
		隔月（M-1）	57%	75%	90%
		第三个月（M-2）	45%	65%	80%
T	下单时间准确率（不区分备货）	当月（M-0）	91%	95%	95%
		隔月（M-1）	64%	70%	90%
		第三个月（M-2）	37%	55%	75%
T	下单项目要货时间准确率（不区分备货）	当月（M-0）	48%	70%	95%
		隔月（M-1）	32%	60%	90%
		第三个月（M-2）	25%	50%	75%


3.2 NT自工序指标达成情况

1. 下单项目清单准确率

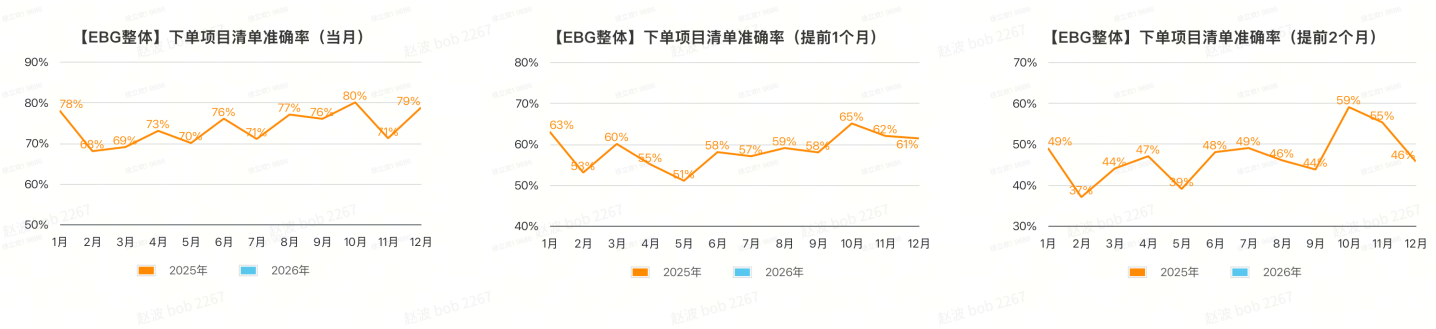


💡 2025年8-12月均值（77%/61%/50%）整体优于2025年1-7月均值（72%/57%/45%）。但12月提前1个月、提前2个月相较10、11月有所下滑。

2. 下单时间准确率

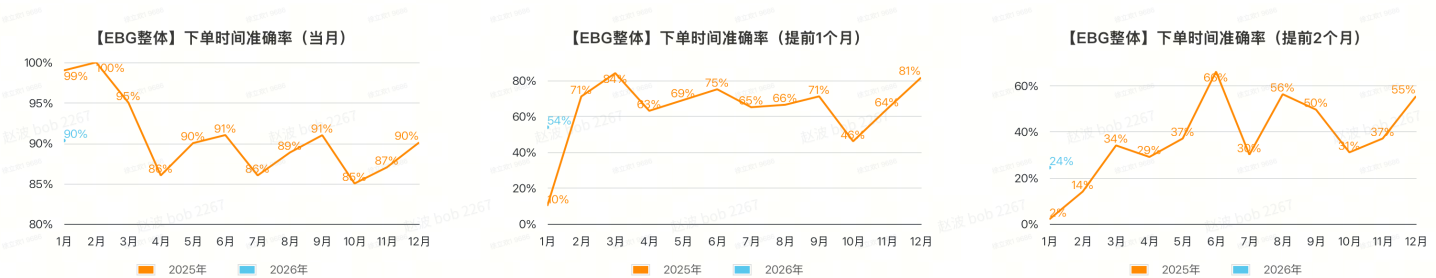

- 当月：2025年8-12月均值（88%）**低于**2025年1-7月均值（92%）。
- 提前1个月、提前2个月：2025年8-12月均值（66%/46%），**整体优于**2025年1-7月均值（62%/30%），**10月起整体准确率均有大幅提升。**

3. 下单项目要货时间准确率

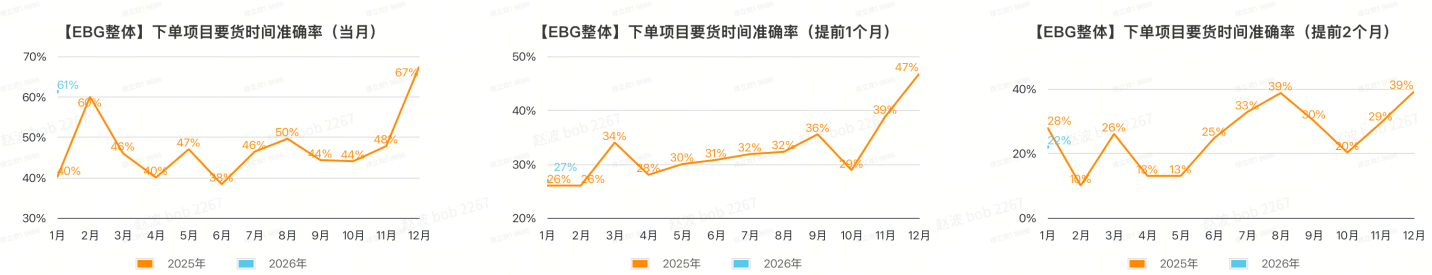

2025年8-12月均值（51%/36%/31%）**整体优于**2025年1-7月均值（45%/30%/21%）。**10月起，整体准确率均有大幅提升。**

指标分类	指标名称	提前期	历史平均值		目标	
			25年1-7月	25年8-12月	第一阶段 26年6月	最终目标
N	下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	当月（M-0）	72%	77%	85%	95%
		隔月（M-1）	57%	61%	75%	90%
		第三个月（M-2）	45%	50%	65%	80%
T	下单时间准确率（不区分备货）	当月（M-0）	92%	88%	95%	95%
		隔月（M-1）	62%	66%	70%	90%
		第三个月（M-2）	30%	46%	55%	75%
T	下单项目要货时间准确率（不区分备货）	当月（M-0）	45%	51%	70%	95%
		隔月（M-1）	30%	36%	60%	90%
		第三个月（M-2）	21%	31%	50%	75%

对比25年自工序实施前后数据对比，指标基本均所提升。**但距离阶段性目标差异仍较大。在N、T自工序改善指标的过程中，发现的问题。**

N指标的问题：

现状及问题	根因分析	改善措施
-------	------	------

①下单项目清单准确率当月（M-0）、隔月（M-1）、第三个月（M-2）分别达成77%、61%、50%，距离阶段性目标差距分别为 8%、14%、15% 。	①N流程执行不严格：个别区域未按照N的流程节点严格执行，漏斗内项目清单自评和清单未及时更新。 ②特价非特价混合下单会引发CRM关单，导致清单不准。	①对月度排名后五的区域做单点业务对话，持续靠后的专项组进驻区域辅导。 ②修改IT系统关单规则。
---	--	--

后续持续监测指标看改善成果。

T指标的问题：

现状及问题	根因分析
①下单时间准确率第三个月（M-2），2025年8-12月指标达成46%，距离阶段性目标差距 9% 。 ②下单项目要货时间准确率当月（M-0）、隔月（M-1）、第三个月（M-2）分别达成51%、36%、31%，距离阶段性目标差距分别为 19%、24%、19% 。	①隔三个月（M-2） 没有管理 ，导致M-2月的下单时间准确率低下。 ②要货时间为销售根据自工序标准填写，没有设立检查校准机制，存在 执行不到位 的情况。

针对上述问题制定改善措施如下：


更新预测管理机制：📅滚动3个月预测管理机制-市场线版本

- ①新增当月（M-0）**要货时间**、隔月（M-1）**要货时间**、隔三个月（M-2）**开标时间、下单时间、要货时间**校准管理。
- ②校准结果按照区域经理及运营BP建议及时完成系统调整。
- ③针对结果指标设定复盘机制及奖惩机制。

流程	流程更新前管什么	流程更新后管什么
滚动3个月预测管理机制	①当月（M-0）的开标时间、下单时间 ②隔月（M-1）的开标时间、下单时间	①当月（M-0）的开标时间、下单时间、 要货时间 。 ②隔月（M-1）的开标时间、下单时间、 要货时间 。 ③ 隔三个月（M-2）的开标时间、下单时间、要货时间 。 ④ 复盘及奖惩机制 。

滚动三个月承诺预测管理流程图

流程类别	销售	运营BP	区域经理	运营BP专项负责人	平台总	区域商务	定价专员
滚动三月承诺预测盘点干预-CRM	销售自盘 在系统上将3T调整到位	通知销售自盘 每月15日 项目初盘 识别异常给出预测建议 调整系统 取值定稿	M+0:当月承诺下单及要货 M+1:隔月预测及要货 M+2:隔两个月预测及要货	是否准入 是否准入 共识项目风险, 是否调出	是否准入	KCP关键管控点	
预测盘点流程职责说明	销售自盘: 盘点未来滚动三个月的承诺预测并在系统上调准预计开标日期、预计下单日期及要求到货日期 调整系统: 按照区域经理及运营BP建议, 按照要求及时完成系统调整	项目初盘: 对标EBG承诺预测2.0标准识别项目是否符合标准并留出项目盘点记录, 识别风险项目, 决策不清楚的给区域区域经理预警 KCP-执行关键管控点: KCP1: 做隔两个月预测干预 控制不符合标准的比例小于40%, 超过40%的项目评估风险拦截/说明准入原因 KCP2: 隔两个月预测转隔月预测干预 控制不符合标准的比例小于40%, 超过40%的项目评估风险拦截/说明准入原因 KCP3: 隔月预测当月转承诺干预 未预测的项目尽量拦截不要做承诺	是否准入 KCP-执行关键管控点: KCP1: 做隔两个月预测干预 控制符合标准的比例小于40%, 超过40%的项目评估风险拦截/说明准入原因 KCP2: 隔两个月预测转隔月预测干预 控制不符合标准的比例小于40%, 超过40%的项目评估风险拦截/说明准入原因 KCP3: 隔月预测当月转承诺干预 未预测的项目尽量拦截不要做承诺	是否准入 KCP-执行关键管控点: KCP1: 做隔两个月预测干预 控制符合标准的比例小于40%, 超过40%的项目评估风险拦截/说明准入原因 KCP2: 隔两个月预测转隔月预测干预 控制不符合标准的比例小于40%, 超过40%的项目评估风险拦截/说明准入原因 KCP3: 隔月预测当月转承诺干预 未预测的项目尽量拦截不要做承诺 输出预警邮件给张敏、潘辉、礼抗及何平决策准入	是否准入 KCP-执行关键管控点: KCP1: 做隔两个月预测干预 控制符合标准的比例小于40%, 超过40%的项目评估风险拦截/说明准入原因 KCP2: 隔两个月预测转隔月预测干预 控制不符合标准的比例小于40%, 超过40%的项目评估风险拦截/说明准入原因 KCP3: 隔月预测当月转承诺干预 未预测的项目尽量拦截不要做承诺 了解项目风险, 决策准入, 确保预测目标达成		
下单流程-ECP	发起下单申请	是否未承诺下单	评估是否下单	是否赶/补数下单	是否可以下单	审批商务信息	审批下单合规性
下单流程职责说明	未承诺项目审批: 关键管控点: KCP4: 未承诺下单干预 识别是否为未承诺干预项目, 评估要货是否具备紧迫性, 不下丢单给出丢单建议 KCP5: 要货时间准确性管控 从看板取上取客户期望发日期给建议区域给销售与渠道沟通进行填写	未承诺项目审批: 关键管控点: KCP4: 未承诺下单干预 识别是否为未承诺干预项目, 评估要货是否具备紧迫性, 不下丢单给出丢单建议	未承诺项目审批: 关键管控点: KCP4: 未承诺下单干预 识别是否为未承诺干预项目, 评估要货是否具备紧迫性, 不下丢单给出丢单建议	未承诺项目审批: 关键管控点: KCP4: 未承诺下单干预 识别是否为未承诺干预项目, 评估要货是否具备紧迫性, 不下丢单给出丢单建议	未承诺项目审批: 关键管控点: KCP4: 未承诺下单干预 识别是否为未承诺干预项目, 评估要货是否具备紧迫性, 不下丢单给出丢单建议	要货时间准确性管控: 关键管控点: KCP5: 要货时间准确性管控 销售与渠道沟通CES系统上填写的客户期望发日期 (参考BP给的备货日期范围进行填写, 如果不能管控住准需要反馈不准原因给到运营BP)	

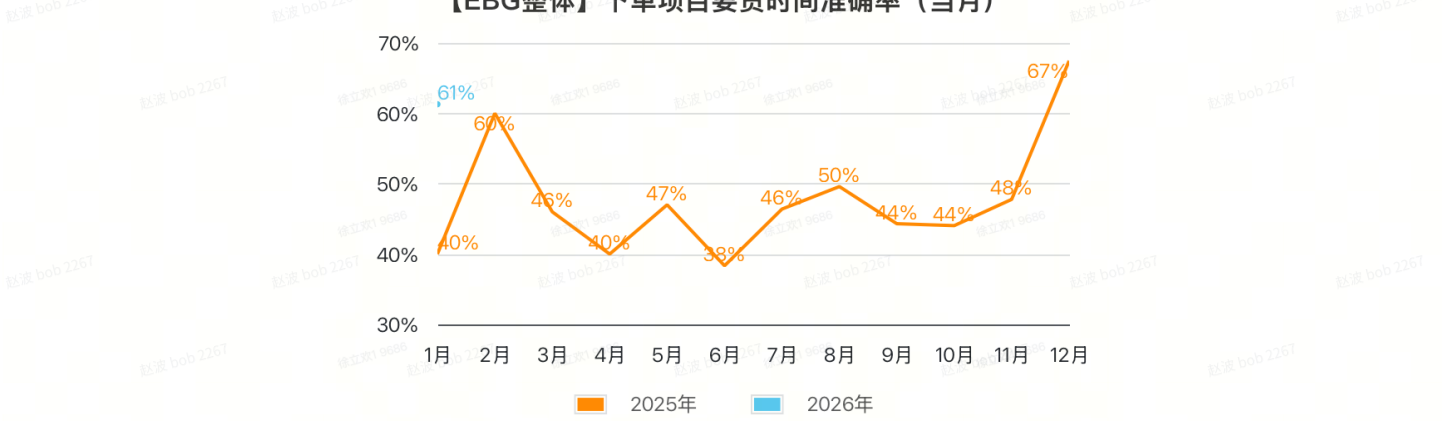

分类	问题
更新不及时	2025年10月-2026年1月，在供应链供应经理盘点项目过程中共抽检393个项目，其中42个项目出现未及时更新NT的情况，占比11%。 目前配套预测管理机制为每月16-19日会统一更新，月度更新存在滞后性，如果配套机制改为周度更新，又会增加大量的工作量。是否有更好的办法？
T的良品条件	特殊项目（EPC\投融资\AIGC等），NT指标比较低，通过与销售的复盘，发现项目运作周期长、运作流程复杂，N和T较难判定准确，如何去精进良品的判断条件？
客期管理	EBG特价订单客期未关联SLA，且和销售漏斗的要货时间脱节，导致供需差异、急单率高，供应链运营效率低且库存成本高 · 漏斗阶段：漏斗T的要货时间填写随意，未考虑实际需求时间及供应SLA----默认客户标书/合同要求的完工/交付时间可达成，错误的要货时间可能导致供应链备货偏差； 重点考虑下单时间的准确性，未意识到要货时间直接关系到能否交付，给供应链备货带来很大的影响。【漏斗要货时间不合理，缺失共识和SLA的规则约束】 · 下单阶段：渠道填写的客期未考虑销售在漏斗阶段摆放的要货时间---供需不匹配导致OTD差；且未考虑供应SLA，客期在当天的占比高----急单导致供应链不得不提前大量库存。 渠道对漏斗备货的需求不了解，在填写客期的时候，没有相应的机制和规则去引导如何填写，针对要货紧急的会认为客期摆放在当天最稳妥【订单客期未关联漏斗和供应SLA，缺失联动机制和规则约束】
分批下单	针对分批下单项目，当前CRM系统不支持多个要货时间的填写，目前通过手工进行管理。当前已完成IT方案的设计，待完成立项后进行开发。当前已完成IT方案的设计，待完成立项后进行开发。☞CRM分批承诺/备货需求 IT方案上线前，需要投入大量的人力针对分批项目的要货时间修订并匹配到系统中，容易出错。是否有更好的办法？
