

投标交付方案评审 (DRB) 规范 V2.0

1. 目的

规范交付方案评审流程, 确保从产品、供应、实施及回款计划等维度全面评估风险, 依据专业知识及评审标准, 对交付方案各维度进行细致评审, 识别潜在风险, 评估应对措施, 通过 DRB 评审结论为投标决策 (BR) 提供准确、可靠的输入信息, 提高项目落地与项目盈利能力。

2. 范围

TBU/EBG/CBG 所有国内直签项目。

3. 术语和定义

BC (Business Case) : 单独采购类项目

EC (Explore Case) : 探索类项目

DC (Design Case) : 客户开发类项目

OC1 (Order Case) : 集团框架采购类项目

OC2 (Order Case) : 省级框架采购类项目或集团为某省/子公司采购类项目

DRB (Delivery Review Bid) : 投标交付方案评审, 项目投标决策 (BR 评审) 前, 根据客户招标要求, 通过交付集成采购、供应、技服、合同等模块制定交付方案, 输出集成交付方案, 并系统评估交付计划和交付风险。

4. 职责

4.1 DRB 材料制作人

4.1.1 根据招标文件及产品、供应、技服接口人提供的信息编制 DRB 报告。

4.1.2 安排评审会议相关事宜, 包括组织 DRB 评审会及输出会议纪要或评审结论。

4.1.3 跟踪评审结论的反馈与执行情况, 确保风险闭环管理。


4.2 DRB 材料接口人

4.2.1 根据 DRB 材料制作人需求提供真实可靠的信息输入。

4.3 DRB 评审人

4.3.1 评审 DRB 材料制作人提交的报告, 确定风险应对方案的可行性, 为后续项目交付提供保障。

5. DRB 评审流程

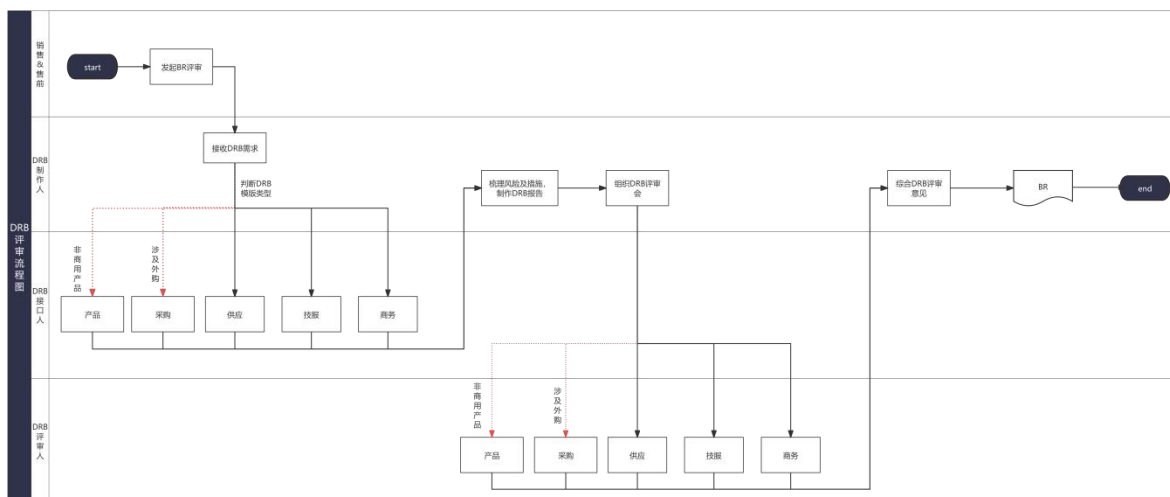

5.1 DRB 需求发起

销售/售前在系统内发起 BR/CR 流程。

5.2 DRB 需求接收

5.2.1 系统会分发给 DRB 流程接口人, DRB 流程接口人会分发给对应 DRB 制作人。

5.2.2 DRB 制作人组织交付团队解读招标文件及客户实际需求, 根据项目类型选取 DRB 报告模版。

5.2.3 DRB 评审模板:

序号	项目类型		DRB 模板要求	DRB 评审人资源池	备注
1	BC	维保类合同	纯服务	服务	仅需 IT 系统内评审
		正式商用产品, 招标金额 < 30 万	极简版	供应	仅需 IT 系统内评审
		正式商用产品, 招标金额 ≥ 30 万	基础版	集团/区域资源池	仅需 IT 系统内评审
		非商用产品	标准版	集团/区域资源池	IT 系统内评审前需召开评审会议
2	EC	探索类项目	极简版	供应	仅需 IT 系统内评审
3	DC	参与客户开发类项目	极简版	供应	仅需 IT 系统内评审
4	OC1	全部类型	标准版	集团资源池	IT 系统内评审前需召开评审会议
		统谈分签	极简版	供应	仅需 IT 系统内评审
5	OC2	全部类型	标准版	区域资源池	IT 系统内评审前需召开评审会议

5.3 DRB 材料制作

5.3.1 通过各专业 DRB 接口人提供的计划和风险制作 DRB 材料。

5.3.2 提交材料需附带初步的风险识别清单，注明已识别风险及其初步评估，将包含供应计划、实施计划、回款计划及产品计划（成熟度）等内容的交付方案提交 LTC-平台。交付方案应遵循公司统一模板，内容详实，确保符合 SMART 原则。

5.4 DRB 评审资源池

5.4.1 根据 DRB 评审人名单组织 DRB 评审会议。

5.4.2 DRB 评审团队：

评审团队	评委归属	DRB 评审人	DRB 各专业负责人	备注
TBU 集团项目评审团队	项目服务评审	郑磊 1	孙华新（移动）	涉及其他产品售后由 TBU 售后拉通
			权威 1（电信）	
			陈勋（联通）	
	项目供应评审	张璐琦	李仁罡（DCN）	/
			王立丰（5G/高三/家宽）	/
	项目产品研发评审	杨英	黄金灿（直放站）	产品未过 ADCP 参与评审
			李志强（基站类）	产品未过 ADCP 参与评审
			蔡锴晔（家宽）	产品未过 ADCP 参与评审
	项目外购品评审	蔡文俊	黄心凤	涉及外购品参与评审
	项目交付评审	蔡国营	刘嘉	/
			朱瑞伟	/
TBU 区域项目评审团队	项目服务评审	郑磊 1	省区售后	涉及其他产品售后由 TBU 售后拉

				通
	项目供应评审	张璐琦	李仁罡 (DCN)	/
			王立丰 (5G/高三/家宽)	/
	项目外购品评审	蔡文俊	黄心凤	涉及外购品 参与评审
	直放站研发评审	黄金灿	PDTL	产品未过 ADCP 参与评 审
	基站类研发评审	李志强	PDTL	产品未过 ADCP 参与评 审
	家宽项目研发评审	蔡锴晔	PDTL	产品未过 ADCP 参与评 审
	项目交付评审	刘嘉（移 动）	省区商务	/
朱瑞伟 (电联)		省区商务	/	
CBG 评审 团队	项目服务评审	聊俊起	区域服务负责人	/
	项目供应评审	胡继辉	客户市场计划	/
	项目交付评审	郝怀志	客户商务负责人	/
	项目外购品评审	蔡文俊	黄心凤	/
EBG 评审 团队	辽宁区域服务评审	张鑫 1	区域项目服务负责人	/
	黑吉区域服务评审	刘锴	区域项目服务负责人	/
	天津区域服务评审	闻晓亮	区域项目服务负责人	/
	河北区域服务评审	范继承	区域项目服务负责人	/
	上海区域服务评审	姚尧	区域项目服务负责人	/
	浙江区域服务评审	刘勇	区域项目服务负责人	/
	江西区域服务评审	吴汉伟 wyatt	区域项目服务负责人	/
	广东区域服务评审	周洪	区域项目服务负责人	/
	海南区域服务评审	周洪	区域项目服务负责人	/
	湖南区域服务评审	贺小平	区域项目服务负责人	/
	湖北区域服务评审	陈庆 1	区域项目服务负责人	/
	广西区域服务评审	杨长清	区域项目服务负责人	/
	福建区域服务评审	郑剑希	区域项目服务负责人	/

	山东区域服务评审	何雨阳	区域项目服务负责人	/
	安徽区域服务评审	李响	区域项目服务负责人	/
	江苏区域服务评审	沈远照	区域项目服务负责人	/
	北京区域服务评审	赵广伟	区域项目服务负责人	/
	河南区域服务评审	陈兴柱	区域项目服务负责人	/
	蒙晋区域服务评审	王艳冬 1	区域项目服务负责人	/
	陕西区域服务评审	王健凯	区域项目服务负责人	/
	甘青宁区域服务评审	袁波	区域项目服务负责人	/
	新疆区域服务评审	王伟华	区域项目服务负责人	/
	川藏区域服务评审	梅林	区域项目服务负责人	/
	云南区域服务评审	李斌	区域项目服务负责人	/
	贵州区域服务评审	周向祥	区域项目服务负责人	/
	重庆区域服务评审	王一潇	区域项目服务负责人	/
	金融行业服务评审	赵俭	行业项目服务负责人	/
	政府交通行业服务评审		行业项目服务负责人	/
	教育行业服务评审		行业项目服务负责人	/
	企业行业服务评审		行业项目服务负责人	/
	医疗系统部服务评审		行业项目服务负责人	/
	AIGC 行业服务评审		行业项目服务负责人	/
	企业教育医疗行业服务评审		行业项目服务负责人	/
	项目供应评审	张璐琦	区域市场计划	/
	项目交付评审	郝怀志	区域商务负责人	/
	项目外购品评审	蔡文俊	黄心凤	/

5.5 DRB 系统评审

5.5.1 评审小组系统内收到 DRB 交付方案后, 在 1 个工作日内对方案的初步研读, 并依据评审标准进行风险识别与初步评估。若方案不符合要求, 驳回 DRB 方案, DRB 制作人 1 个工作日内补充完善。

5.5.2 评审小组系统内收到 DRB 交付方案后, 应为“1 个工作日内未驳回”即视为同意召开线上会议进行评审。

5.6 正式评审会议

5.6.1 DRB 材料制作人确定正式评审会议时间, 提前 1 个工作日通知各成员, 会议由 DRB 材料制作人主持。

5.6.2 DRB 材料制作人在会议上对交付方案进行详细阐述, 重点说明各计划维度中的风险识别情况及应对措施。

5.6.3 评审小组成员依据评审标准, 对交付方案各维度风险的全面性、应对措施的有效性进行提问、讨论与评估。

5.6.4 评审过程中, 成员应依据 SMART 原则对风险应对措施进行审核, 确保措施具体、可衡量、可达成、相关且有时限。

5.6.5 积极参与评讨论, 发表专业意见, 为形成客观、准确的评审结论提供依据。

5.6.6 形成评审结论: 评审小组经充分讨论后, 依据风险识别、评估及应对措施情况, 形成评审结论。评审结论分为“同意”和“不同意”。

5.6.6.1 “同意”的定义: 满足风险识别全面性与举措制定有效性, 且不存在无法消除的合同履约风险, 或其风险影响在企业风险承受范围内, 评审意见为“同意”, 支持参与该投标项目。

5.6.6.2 “不同意”的定义未满足风险识别与举措制定标准，或存在无法消除的合同履约风险且其影响超出企业风险承受范围，评审意见为“不同意”，建议不参与该投标项目。

5.7 其他说明

5.7.1 对于“需重新评审”的交付方案

5.7.1.1 重新提交评审时，需详细说明针对上一轮评审意见的改进情况，确保风险得到有效识别与应对。评审流程与初次评审相同。

5.7.1.2 若两次线上评审结论均为“不通过”，则最终评审结果为“不通过”。

5.7.1.3 评审结论作为投标决策（BR）的重要输入信息，DRB 制作人在评审会议结束后 1 个工作日内，将评审结论录入系统。

5.7.1.4 DRB 评审流程从流程发起到流程结束时效要求为 5.5 个工作日。

5.7.1.5 项目组将《评审报告》及相关文件发布和归档。

6. 会议相关规定

6.1 会议时间

6.1.1 全程会议录屏，正式评审会议应控制在 1 小时内，特殊情况需延长的，由评委决定。

6.2 参会要求

6.2.1 评审小组成员应按时参加会议，如有特殊情况无法参会，需提前 1 个工作日向 DRB 材料制作人说明，并授权具有相应能力的代表参会。

6.2.2 参会人员应提前做好准备工作，熟悉交付方案内容，确保能够在会议上有效发表意见。

6.3 会议纪律

6.3.1 会议期间, 参会人员应将手机调至静音或关机状态, 避免干扰会议进程。

6.3.2 尊重他人发言, 不得随意打断。如有不同意见, 应在发言者阐述完毕后有序提出。

7. 风险闭环管理

7.1 对于“有风险”的交付方案

DRB 风险及应对措施需邮件同步给评审小组备案, 并抄送相关部门负责人。

7.1.1 DRB 材料制作人负责跟踪风险措施闭环情况, 双周与项目团队沟通, 确保风险应对措施按计划推进。

商务部

2025 年 9 月 25 日
