

EBG关于各区域 高质量落实MO商机管理流程的运转机制

一、EBG MO管理商机流程卡点设计及业务目标

关键节点	描述	责任人	运转机制	机制运转负责人
立项评审决策（过渡方案）	进入漏斗满足立项条件的项目7天之内需要发起立项评审决策，决策是否立项及确定项目组成员，每周销售例会呈现立项项目池，及是否按时召开立项评审决策会；	销售经理	月度、季度进行以上5个关键任务执行看板，应用至QBC季度考核打分，每个未执行周关键任务次数，扣减0.5分QBC分值，直接应用。	销管BP
立项启动会	立项评审会确定立项且明确项目组、组建项目群后，7天内需要开第一次项目分析会，既立项启动会；每周销售例会呈现立项启动会召开看板，及是否按时召开立项启动会；	项目经理		
解决方案评审会	明确客户需求后，制定对应的解决方案，并及时发起解决方案评审会。同时，在整个过程中及时的对解决方案进行刷新，保证方案有效性。	技术负责人		
标前评审会	获取到正式标书3天内，组织开展标前评审会，每周销售例会呈现30日开标内开标项目清单及召开标前评审会的数据呈现，及是否按时召开标前评审会；	客户关系负责人		
赢/丢单复盘会	丢单或者赢单（下单）的项目要在关闭活动商机时间2周内，开展赢丢单复盘经验总结，每周销售例会呈现赢丢单复盘数据呈现，及是否按时完成赢丢单复盘；	项目经理		

业务目标及盘面数据：

L2流程	L3流程	Q3 L3执行目标	八月数据	L3业务目标	Q3目标值	八月数据	变化与核心差距分析
MO-管理商机	验证商机	60%		立项启动率	80%		
	推进商机	60%		解决方案评审率	100%		
	制定并执行投标策略	60%		标前评审执行率	80%		
	谈判并签订合同	60%		丢/赢单项目复盘率	100%		

二、如何落实运转机制

拟通过各区域销售周例会形式，通过看板数据追踪活动执行情况，销管BP提醒，由区域经理督促相关人员执行流程相关活动。

区域销售周例会流程执行细则：

★ 召开时间： 每周一次

会前准备：

1. 销售准备
- 整理自己名下所有相关商机数据，对数据记录进行分类梳理盘点，搞清楚分别处于什么阶段（线索池满足提交漏斗条件项目，漏斗内满足立项条件待发起立项项目，已立项30天内开标项目等）
2. 销管 BP 准备
- 每周例会前准备上周异常数据、这周需要提醒执行的数据，提前发给区域经理。

◦ 发送会议通知给参会人员（区域全体销售、售前、销管 BP等）。
3. 区域经理准备
- 明确需重点讨论的异常项目及需要提醒执行关键流程活动的项目。

会中要求：

1. 反馈与跟进

按照看板数据，商机所有人反馈当前项目情况，异常活动是否按照要求进行相关动作执行，下一步执行计划。

销管BP进行实时记录与状态更新。

2. 行动计划与任务

异常数据跟进：对于例会上呈现的异常数据，卡点设计中的流程活动责任人认领并及时行动。

活动跟催与提醒：销管BP对正在进行中的项目做任务提醒，活动责任人明确执行活动截止时间，及时跟进。

会后要求

1. 根据会议要求在CRM及飞书中执行相应操作。具体操作见流程落地指南部分。

三、流程执行落地操作指南

3.1 对各区域具体执行关键流程活动说明

★ **提交漏斗审批：**满足进漏斗条件项目，确保MANT等商机关键信息按照要求明确填写，从售前拿到最新的配置清单，3 T（预计要货时间，预计下单时间，预计开标时间）按要求填写准确清楚，提交进漏斗审批计划，需要区域经理重点关注的其他内容。

1、销售/业务机会所有人/客户关系负责人：登录CRM并填写商机MANT信息并提交进漏斗审批。

（N：需要售前提供配置清单和可信度评分；T：严格按照公司漏斗质量要求准确填写预计要货时间，预计开标时间，预计下单时间；）

2、区域经理：按照要求核实商机信息，交叉验证后审批进漏斗申请。（N：售前提供的配置清单可信度得分，T：预计要货时间，预计开标时间，预计下单时间准确清晰符合填写的标准和要求；其他证据材料核查无误）；根据项目分级分层要求对项目是否立项进行填写。

备注：系统会根据项目分类标准在“分级分层”字段填写对应的项目级别，包括：一般项目，区域级，BU级，BG级。区域级，BU级和BG级项目，一旦通过漏斗审批，并且“是否发起立项申请”字段值为“是”的时候会自动发起项决策申请给对应的审批人（区域级为区域经理，BU级为系统总，BG级为南区，北区平台总）；存在两种特殊场景需要漏斗审批人注意：1）满足立项标准的区域级，BU级和BG级项目一旦修改“是否发起立项申请”字段值为“否”，需要填写具体的不立项原因说明；2）对于不满足立项初始标准的一般项目，如果想要进行立项申请与决策，请先调整“分级分层”中的项目级别，必须为区域级，BU级或者BG级的一种，同时，“是否发起立项申请”字段需要填写为“是”，这样系统会根据上面的审批规则发送具体的决策人进行立项申请的审批。

漏斗审批

LD #

基本信息

漏斗审批名称

LD #

审批提交人

预测类别

可能

所属业务机会

评估者

决策者

客户名

业务机会类型

指标者

项目涉及产品类别

预计开标日期

2025-11-21

预计下单金额(进漏斗时)

508,296

预计开标日期填写依据

渠道反馈

预计下单日期填写依据

渠道反馈

预计下单日期

2025-12-12

净折扣目标(%)

9.65

渠道

本次销售自盘

上次销售自盘记录

是否重客

是

分级分层

BU级

是否发起立项申请

是

不立项原因说明

审批提交时间

2025-08-15 17:19

审批通过时间

共1人

+

-

搜索成员和标签

在取用中

客户代表

有修改权限

★ **商机立项【自动立项审批提交】**：进漏斗满足立项条件的项目，确保立项级别准确，按要求进漏斗后7天内发起立项决策，决策通过的立项项目明确项目组核心成员，并建立线下飞书群运转。

商机立项分层分级标准：


级别	定义	介入的层级	必须的KCP
BG级	满足下列条件之一：重客项目(200w+)-、非优势预估下单金额800w+、部门级解决方案前三单	对应平台管理部总经理、售前技术部总经理、客户体验部总经理、对应系统总、解决方案部总经理、对应大区重客技术经理、销售管理部价格组经理、区域铁三角、项目铁三角	立项评审、立项启动会、解决方案评审、标前评审、复盘总结
BU级	满足下列条件之一：重客项目（200W-）、非优势预估下单金额500w+商机、系统部解决方案前三单，行业类大金额的框采，行业EC&DC类项目	对应系统总、对应行业营销拓展、解决方案部行业负责人、客户体验部行业负责人、对应大区重客技术经理、销售管理部价格组经理、区域铁三角、项目铁三角	立项评审、立项启动会、解决方案评审、标前评审、复盘总结
区域级	满足下列条件之一：非优势预估下单金额200w+商机、直签类项目	区域铁三角、行业经理、项目铁三角、对营销管	立项评审、立项启动会、解决方案评审、标前评审、复盘总结

管制级	一般项目	无	标前评审
关键点： 客户维度：重客商机必须立项（立项团队内固化客户体验负责人） 竞争程度：预测类别优势确保项目不立项 金额维度：触发标准是200w+以上项目进入区域级，500w+以上进入BU级，800w+以上进入BG级 特殊立项维度：可由系统部和平台管理部直接勾选的立项商机，比如：部门级/系统部解决方案前三单、行业类大金额的框采，行业EC&DC类项目、区域直签项目等（需要IT在系统添加“特殊立项”勾选项）			

1、机会所有人：对漏斗内满足立项条件的商机自动发起立项申请



2、区域经理/系统总/主管VP：（区域级、BU级、BG级）审批决策是否立项通过，并**确认项目经理及铁三角人员准确无误。**

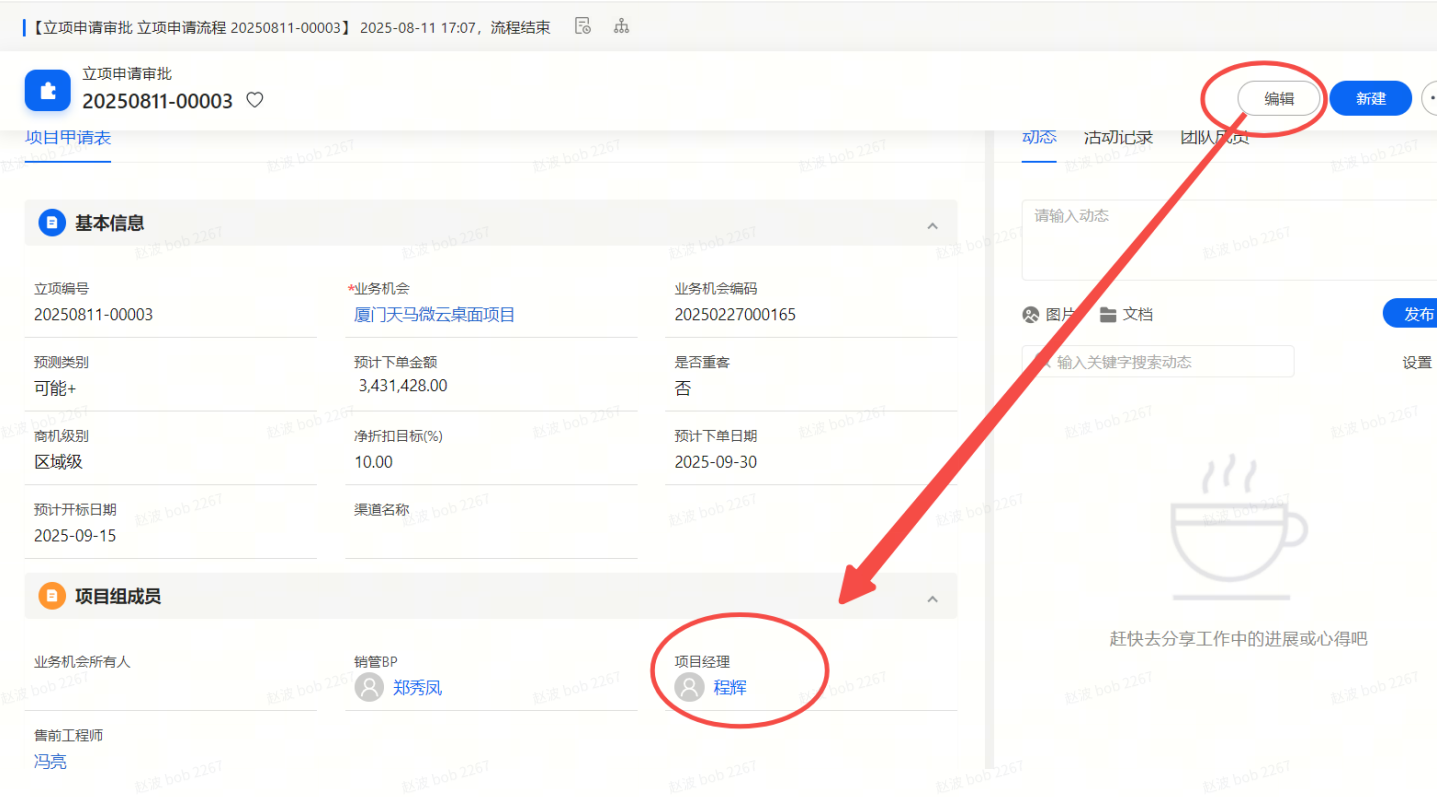

3、销售/机会所有人：在项目审批通过后，启动会之前，在系统中下载“XX立项项目过程管理材料-模版”创建自己项目的项目文档并上传飞书。



★ **立项启动会：**审批通过立项的项目，七日内发起立项启动会（第一次项目分析会），启动会根据项目情况明确项目组成员及分工（在核心项目组成员基础上拉入需要参与的其他项目关键人进飞书群）；

1、区域经理&销管BP：销管BP协助区域经理发起立项启动会（第一次项目分析会），销管BP负责在CRM大项目启动会板块留痕，填写启动会召开时间，系统中下载项目文档（可在文档中下载各独立模块模板填写），并根据项目情况创建对应的项目过程管理文档，填写项目基本信息，人员分工等信息后上传CRM启动会URL栏，供项目后续环节持续更新使用。同时，把项目组其他关键参与人员拉入项目运转飞书群。



★ **解决方案评审会：**根据项目进度和要求组织开展解决方案评审会。对具体时间不做硬性要求，周例会会对数据做跟踪监控，对于立项项目，解决方案评审会执行率目标为100%，原则上所有立项项目都要开解决方案评审会，并按照要求在CRM中留痕，标前评审会之前需要完成解决方案评审会。

1、技术把关负责人（BG/BU级：节点经理；区域级：技术经理）：在解决方案评审会CRM模块按要求完成解决方案评审会留痕和飞书项目过程管理文档填写，重点是明确价值主张，或者明确让项目铁三角进一步明确客户端需求的建议，夯实在客户端构建方案价值认可，愿景重构。

MO流程信息管理(0) 立项申请(0) 大项目启动会(0) 项目分析会(0) 解决方案评审会(0) 查看更多(2)

MO流程信息管理(0) 立项申请(0) 大项目启动会(0) 项目分析会(0) 解决方案评审会(0) 制定招标策略(0) 项目复盘会(0)

新建解决方案评审会

评审会时间: 请选择
解决方案评分: 请输入
评审结论: 请选择
价格策略: 请输入
评审会url下载地址: https://rujie.feshu.cn/wiki/7f0cwg2ALu2Dk8Gc2bmknd?from=auth_no...
评审会url上传: 请输入

★ **项目分析会：**根据项目实际情况组织开展一次或者多次项目分析会，项目分析会过程及相关结论信息在“立项项目过程管理材料”中持续更新。本环节不做看板跟踪，只是CRM系统留痕。

1、项目经理：组织召开不同阶段的项目分析会(价值主张制定，招标策略分析会等)，并在CRM项目分会模块留痕和完成相应飞书项目过程管理文档填写上传工作。

审批信息 拜访记录列表

MO流程信息管理(0) 立项申请(0) 大项目启动会(0) 项目分析会(0) 解决方案评审会(0) 查看更多(2)

MO流程信息管理(0) 立项申请(0) 大项目启动会(0) 项目分析会(0) 解决方案评审会(0) 制定招标策略(0) 项目复盘会(0)

新建项目分析会

分析会url模板下载: https://rujie.feshu.cn/wiki/7f0cwg2ALu2Dk8Gc2bmknd?from=auth_no...
分析会时间: 请选择
分析会参与人: 请输入
下一步行动计划: 请输入
项目分析会url上传: 请输入

★ **标前评审会：**在正式获取标书后三日内组织标前评审会，销管BP会根据预计开标日期，提前30天进行提醒和跟踪，确保活动按时执行，标前评审会内容及结论同其他关键卡点，需要在CRM中留痕记录，并将工作内容和结论在“立项项目过程管理材料”中持续更新。

1、**技术把关负责人**（BG/BU级：节点经理；区域级：技术经理）：技术负责人根据解决方案评审情况给出标前分析会相关技术方案审核，价格策略，投标策略的建议，并在CRM标前分析会模块留痕和完成相应飞书项目过程管理文档填写上传工作。**项目铁三角**根据技术负责人输入的标前策略进行修订和完善。

标前分析会


分析会url模板下载: https://rujie.feshu.cn/wiki/7f0cwg2ALu2Dk8Gc2bmknd?from=auth_no...
分析会时间: 请选择
分析会参与人: 请输入
下一步行动计划: 请输入
分析会url上传: 请输入
分析会材料: 上传或点击下载文件

商机级别: 请选择
项目经理: 请输入
业务机会所有人: 请输入
售前工程师: 请输入
销售工程师: 请输入

此处内容会带出，无需填写

★ **赢/丢单复盘会：**丢单或者赢单（下单）的项目要在关闭活动商机时间2周内，开展赢丢单复盘经验总结。

1、项目经理：通过CRM的赢/丢单复盘环节进行系统留痕，并将工作内容和结论在“立项项目过程管理材料”中持续更新。根据看板数据持续监控与跟催。



★ **MO流程周例会运转及跟进：**周例会提供看板数据及跟催计划并提前分享给区域经理供周例会运转使用。月度，季度数据盘点，按照要求对流程整体执行情况及业务目标达成情况进行数据汇总及报告。

1、销管BP：按照周例会节奏配合区域经理及销售运转流程执行落地。

1) 商机立项进展：

业务责任人：销售&区域经理

周例会呈现数据看板：立项申请进展（通过CRM访问看板，访问路径：）

→ 立项申请进展 自定义筛选 业务机会预计下单日期: 等于 2025年全年 区域

无

业务机会编码	业务机会名称	重客	机会所有人	预计下单金额(本币)	预测类别	预计开标日期	预计下单日期	评审截止日期	实际评审日期
		否			可能+	2025/11/11	2025/11/26	-	-
		是		1,100,000.00	确保	2024/03/21	2025/08/18	-	-
		否		1,329,917.29	可能-	2025/11/07	2025/12/04	-	-
		否		654,290.04	优势	2025/11/17	2025/12/18	-	-
		是		1,109,769.10	可能-	2025/09/26	2025/11/21	-	-
		否		363,360.00	可能+	2025/11/07	2025/12/06	-	-
		否		1,791,847.40	可能-	2025/10/16	2025/11/14	-	-
		否		1,365,602.12	可能+	2025/10/17	2025/11/14	-	-
		否		591,550.00	可能+	2025/10/10	2025/11/13	-	-
		否		1,032,552.90	可能+	2025/10/03	2025/11/08	-	-

关键动作：

查看漏斗内项目是否及时立项，如果没有出现评审截止日期，说明项目还没有进行立项动作，需要跟催对应的商机所有人在CRM系统中进行立项申请，具体操作方法参加上文**发起立项**部分说明。**此环节操作属于过渡方案，待自动化系统立项方案上线后，销售无需手动发起立项，商机进漏斗审批后，系统自动根据项目级别发起立项决策申请并完成立项决策流程。**

2) 立项启动会进展：

业务负责人：项目经理

周例会呈现数据看板：立项启动会进展（通过CRM访问看板，访问路径：）

➡ 启动会评审进展

自定义筛选

业务机会下单日期：等于 2025年

锐捷区域

无

②

业务机会是否活动中: 包含(值列表) 1

业务机会是否进入漏斗: 等于 1

业务机会编码	业务机会名称	重客	机会所有人	预计下单金额(本币)	预测类别	预计开标日期	预计下单日期	启动截止日期	实际启动日期
		否			可能+	2025/11/11	2025/11/26	-	-
		是		1,100,000.00	确保	2024/03/21	2025/08/18	-	-
		否		1,329,917.29	可能-	2025/11/07	2025/12/04	-	-
		否		654,290.04	优势	2025/11/17	2025/12/18	-	-
		是		1,109,769.10	可能-	2025/09/26	2025/11/21	-	-
		否		363,360.00	可能+	2025/11/07	2025/12/06	-	-
		否		1,791,847.40	可能-	2025/10/16	2025/11/14	-	-
		否		1,365,602.12	可能+	2025/10/17	2025/11/14	-	-
		否		591,550.00	可能+	2025/10/10	2025/11/13	-	-
		否		1,032,552.90	可能+	2025/10/03	2025/11/08	-	-

关键动作：

根据要求，通过立项的商机项目经理需要在七天内组织开展项目启动会，通过看板的“启动截止日期”跟催每个立项项目启动会的开展。进行中的提醒截止日期，未按照要求完成的需要提醒责任人进行及时跟进动作，确保所有项目有序推进。

3) 标前分析会项目进展

业务负责人：客户关系负责人

周例会呈现数据看板：标前分析会项目进展（通过CRM访问看板，访问路径：）

业务机会:是否活动中: 包含(值列表) 1 业务机会:是否进入漏斗: 等于 1

业务机会编码	业务机会名称	重客	机会所有人	预计下单金额(本币)	预测类别	预计开标日期	预计下单日期	标前分析会截至日期	实际分析会时间
		否			可能+	2025/11/11	2025/11/26	2025/11/04	--
		是		1,100,000.00	确保	2024/03/21	2025/08/18	2024/03/14	--
		否		1,329,917.29	可能-	2025/11/07	2025/12/04	2025/10/31	--
		否		654,290.04	优势	2025/11/17	2025/12/18	2025/11/10	--
		是		1,109,769.10	可能-	2025/09/26	2025/11/21	2025/09/19	--
		否		363,360.00	可能+	2025/11/07	2025/12/06	2025/10/31	--
		否		1,791,847.40	可能-	2025/10/16	2025/11/14	2025/10/09	--
		否		1,365,602.12	可能+	2025/10/17	2025/11/14	2025/10/10	--
		否		591,550.00	可能+	2025/10/10	2025/11/13	2025/10/03	--
		否		1,032,552.90	可能+	2025/10/03	2025/11/08	2025/09/26	--

关键动作:

获取到正式标书3天内，组织开展标前评审会，每周销售例会呈现30日开标内开标项目清单及召开标前评审会的数据呈现，及是否按时召开标前评审会；根据实际分析会时间字段比对标前分析会截止时间来判断会议是否正常进行，对不同情况的记录和责任人员进行提醒和跟催，确保完成

4) 赢丢单复盘会进展

业务负责人: 项目经理

周例会呈现数据看板: 赢丢单复盘会进展（通过CRM访问看板，访问路径:）

业务机会:是否活动中: 包含(值列表) 0 业务机会:是否进入漏斗: 等于 1

业务机会编码	业务机会名称	重客	机会所有人	预计下单金额(本币)	预测类别	预计开标日期	预计下单日期	复盘截止日期	复盘时间
		否		390600.00	确保	2020/03/02	2020/03/03	2022/03/12	--
		否		70,212.48	确保	2020/04/17	2020/05/15	2022/03/12	--
		否		113,702.40	确保	2020/01/16	2020/04/28	2022/03/12	--
		否		593,776.80	可能-	2020/09/09	2020/11/24	2020/09/23	--
		否		205,205.50	确保	2020/04/02	2020/04/24	2022/03/12	--
		否		23,296.00	确保	2020/03/17	2020/03/19	2022/03/12	--
		否		157,291.20	可能-	2021/10/17	2021/11/23	2021/11/01	--
		否		286,780.00	确保	2024/05/19	2024/10/18	--	--
		否		1,469,774.08	可能-	2022/08/16	2022/09/23	2022/08/17	--
		否		405,144.00	确保	2020/02/12	2020/02/12	2022/03/12	--
		否		384,216.00	可能-	2020/09/09	2020/09/09	2022/03/12	--

关键动作:

丢单或者赢单（下单）的项目要在关闭活动商机时间2周内，开展赢丢单复盘经验总结，每周销售例会呈现赢丢单复盘数据呈现，及是否按时完成赢丢单复盘；查看复盘截止日期和复盘时间字段，判断动

作是否正常进行，并进行跟催和提醒。

备注：解决方案评审由于时间相对不固定，所以不通过看板跟催，但是会通过月度，季度报表查看解决方案评审会开展的情况。

3.2 落地执行检查机制

月度、季度进行以上关键任务执行看板，应用至QBC季度考核打分，每个未执行周关键任务次数，扣减0.5分QBC分值，直接应用。

★ 设计总体进度看板来追踪各区域，系统部项目管控进度

报表查看方式：

登录销售易CRM-->选择左侧智能分析一级菜单-->选择智能分析二级菜单-->选择公共空间-->查看“MO流程看板”



截止9月25日运转情况-漏斗内全部项目立项运转看板

二级部门/大区/ BG	锐捷区域	业务机会	立项申请审批	大项目启动会	解决方案评审会	标前分析会
合计		509	528	75	5	13
	重庆	22	22	1	0	1
	湖南	13	15	0	0	0
	广西	6	6	1	1	0
	广东	43	45	1	0	0
	湖北	18	19	0	0	0
	浙江	20	20	0	0	0

中国南区平台管理部	浙江	30	33	0	0	0
	贵州	5	5	0	0	0
	福建	8	8	6	0	0
	江西	10	11	3	0	0
	川藏	13	13	0	0	0
	云南	13	13	1	0	0
	上海	12	12	0	0	0
中国北区平台管理部	江苏	19	19	0	0	0
	河北	6	7	5	0	0
	山东	38	38	11	0	1
	蒙晋	7	7	0	0	1
	甘青宁	17	18	2	0	2
	陕西	9	9	2	0	0
	北京	9	8	7	2	3
	辽宁	12	15	0	0	0
	河南	13	13	3	0	0
	安徽	18	19	0	0	0
	新疆	16	17	13	0	0
	天津	10	10	1	0	0
	黑吉	8	10	2	0	0
智能建筑及ICT系统部	智能建筑及ICT系统部	1	0	0	0	0
政府交通系统部	政府交通系统部 党政财税行业部	8	9	5	2	1
	政府交通系统部 公共安全行业部	13	16	11	0	0
	政府交通系统部 交通行业部	14	15	0	0	3
	政府交通系统部 应急民生行业部	5	5	0	0	0
企业系统部	企业系统部央企 大客户二部	2	2	0	0	0
	企业系统部发电 大客户部	9	9	0	0	0
	企业系统部央企 大客户一部	3	3	0	0	0
企业级AIGC及服务业务系统部	企业级AIGC及服务业务系统部大客户部	4	4	0	0	1
	企业系统部城市					

金融系统部	金融系统部城商农信业务部	6	6	0	0	0
	金融系统部北方大区	11	11	0	0	0
	金融系统部保险证券业务部	5	5	0	0	0
	金融系统部股份制业务部	17	17	0	0	0
	金融系统部国有大行业务部	6	6	0	0	0
	金融系统部南方大区	10	9	0	0	0
教育系统部	教育系统部大客户部	2	3	0	0	0


截止9月25日运转情况-预计下单时间在2025年立项项目运转看板：

二级部门/大区/BG	锐捷区域	业务机会	立项申请审批	大项目启动会	解决方案评审会	标前分析会
合计		280	280	67	5	9
BG级		27	27	6	2	2
BU级		97	97	25	1	0
区域级		156	156	35	2	5
中国南区平台管理部	广西	4	4	1	1	0
	江西	4	4	3	0	0
	云南	8	8	1	0	0
	川藏	4	4	0	0	0
	浙江	18	18	0	0	0
	贵州	2	2	0	0	0
	福建	2	2	2	0	0
	上海	2	2	0	0	0
	湖北	10	10	0	0	0
	湖南	7	7	0	0	0
	广东	21	23	0	0	0
	重庆	9	9	1	0	0
	黑吉	7	9	2	0	0
	安徽	9	9	0	0	0

中国北区平台管理部	江苏	14	14	0	0	0
	天津	5	5	1	0	0
	陕西	8	8	2	0	0
	河南	4	4	3	0	0
	河北	4	5	4	0	0
	北京	4	3	4	2	1
	甘青宁	3	3	2	0	2
	山东	26	26	11	0	1
	新疆	13	13	13	0	0
	辽宁	8	11	0	0	0
政府交通系统部	政府交通系统部交通行业部	11	12	0	0	1
	政府交通系统部党政财税行业部	6	7	5	2	1
	政府交通系统部应急民生行业部	2	2	0	0	0
	政府交通系统部公共安全行业部	11	14	11	0	0
企业系统部	企业系统部发电大客户部	4	4	0	0	0
	企业系统部央企大客户一部	3	3	0	0	0
企业级AIGC及服务业系统部	企业级AIGC及服务业系统部大客户部	3	3	0	0	1
	金融系统部北方大区	8	8	0	0	0
	金融系统部城商农信业务部	3	3	0	0	0
	金融系统部南方大区	9	8	0	0	0

金融系统部	南方大区					
	金融系统部 保险证券业务部	4	4	0	0	0
	金融系统部 国有大行业务部	5	5	0	0	0
	金融系统部 股份制业务部	10	10	0	0	0
教育系统部	教育系统部 大客户部	1	1	0	0	0

各会议执行率柱状图

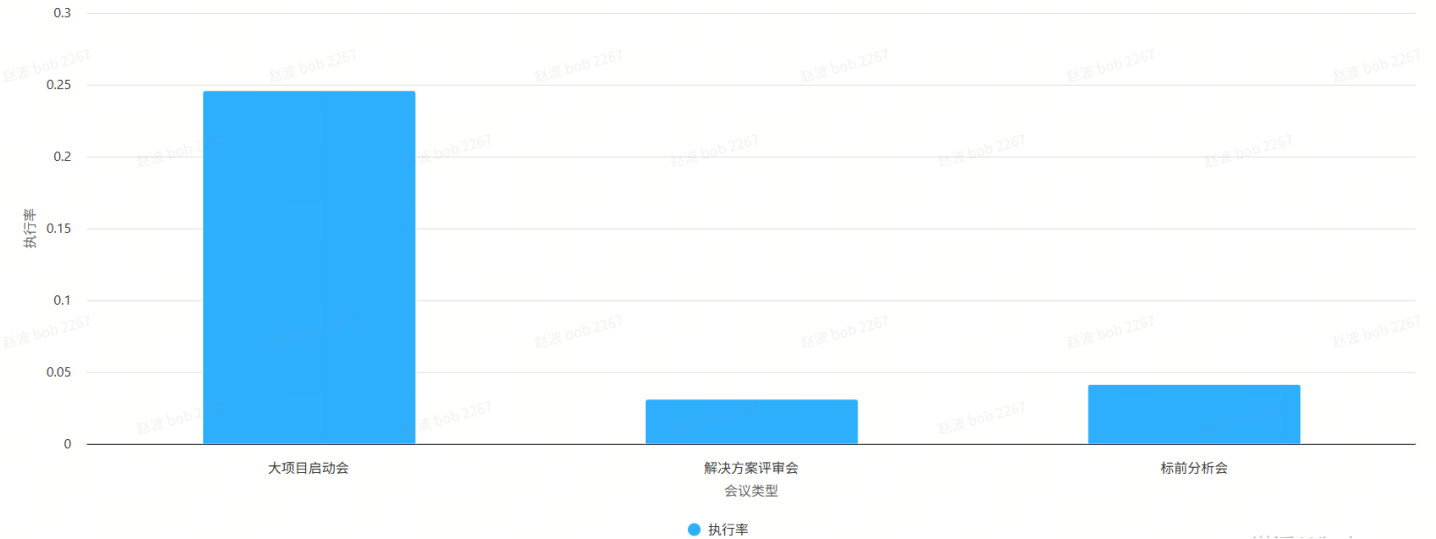

★ 会议执行率分析与业务洞察

1、整体执行率偏低，流程落地存在明显断点，召开相关分析会议未留痕，相关信息及资料未上系统。

大项目启动会平均执行率为23.9%，解决方案评审会为1.8%，标前分析会为3.2%，均远未达到应有闭环要求。其中，大项目启动会执行情况相对较好，但仍有超过四分之三的区域执行率低于50%；解决方案评审会和标前分析会执行严重不足，多数区域召开次数近乎空白。

2、区域间执行差异显著，大部分区域及大客户部未启动流程运转，销管运营BP周例会看板同步后未安排相关动作。

北京、新疆、福建、河北、河南及部分政府交通系统部下属行业部执行，大项目启动会执行率达到或接近100%，具备标杆示范效应；而浙江、广东、江苏、湖北、湖南、辽宁等重点区

域多项会议执行率为零，流程执行缺位问题突出。甘青宁和企业级AIGC系统部在标前分析会方面表现相对较好，其他区域普遍忽视该环节。

3、立项项目为可能+-项目，更需要组织协同推优，现阶段存在管理缺失，提请重视。

当前流程执行存在结构性短板：项目启动会为基础动作，多个核心区域仍未有效执行；解决方案评审会召开极少，反映复杂项目有效策略趋势；标前分析会未执行，投标决策缺乏前置评估支撑。



下一步要求：

目标：10月20日前，所有区域完成立项项目分析会

（涉及招投标的完成标前分析、已闭环完成赢丢单分析，结论上传销售易大项目管理板块）；

- 1、所有立项项目按照流程在团队内执行，召开不同类型项目分析会，按照定级邀请对应人员参加，形成会议结论及策略，并将会议结果在大项目管理模块留痕方便后续记录；
- 2、分层分级管理，隔周同步BG级、BU级项目，给到对应平台总、系统总，进行项目管理部署及执行，平台管理部已启动；
- 3、周看板同步晾晒，落后区域项目组推动平台总、系统总进行集中项目分析日；

后续流程执行优化



1. **强化关键会议执行机制：**针对解决方案评审会、标前分析会和赢丢单复盘数量偏低的问题，制定强制性会议触发机制，特别是在重大项目节点前必须召开相应会议，确保决策科学性和经验闭环。
2. **推动流程均衡发展：**在保持高立项量的基础上，重点提升中后端会议的覆盖率，尤其是广东、浙江、江苏等高立项低执行区域，需加强项目过程管理督导。
3. **推广优秀实践：**总结北京、新疆及政府交通系统部等单位的经验，组织跨区域交流分享，提升整体项目管理水平。
4. **建立会议执行考核指标：**将四类会议的召开频次与质量纳入区域绩效考核体系，推动流程落地常态化。
5. **定期复盘与可视化监控：**利用看板数据，动态监控各区域进展，及时发现并干预异常趋势。

