

专项总结：



会议纪要					
会议时间	2025/2/6	会议地点	飞书线上会议	参会人员	曹曦、陈涌晖、游发星、李冰
会议议程	关键行动项进展拉通				

行动计划					
序号	行动项	负责人	计划跟进时间	状态	完成
1	要货时间准确性判断标准确定和共识-BI看板	张璐琦, 吴志伟、张萌	2025/11/28	已完成	2025/
2	销售预测流程管理决策,要求到货时间管起来,M-2管起来;决策是否管理,具体管理办法和流程	李冰, 张萌	2025/11/28	已完成	2025/
3	IT方案跟进: 针对下单和要货时间IT优化方案共识,包括:前端产品方案配置中显示SLA;分批要货方案优化;CES渠道要货时间与推荐客期管理;	张璐琦	2025/11/28	已完成	2025/
4	N的准确率: 组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。	蔡聪	2025/12/14	已完成	2025/
5	3T准确率: 组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。 开标时间准确率复盘-张萌/许佳乐 下单时间准确率可以分享销售隔月预测复盘结果 要货时间准确率复盘可以做完行动项以后再看--张萌, 璐琦一起核对, 上BI看板对齐取值, 看板建立后, 第一时间对齐指标达成率, 同步专项组;	陈涌晖	2025/12/14	已完成	2025/
6	MO流程植入供应链协同规则,推动试点区域运行,同时迭代优化现有流程	曹曦	2025/12/29	进行中	
7	提升N过程中的准确性和及时更新: 待明确活动跟进接口人, MO流程执行过程中的解决方案评审和标前评审会由技术把关人 (BU/BG:节点经理, 区域: 技术经理) 来统一做分析和系统留痕	蔡聪	2025/12/25	已完成	2025/
8	把T的良品条件进一步精进	沙书立, 翁石强	2025/12/31	进行中	
9	推动销售预测流程的评审和发布; 组织区域培训新流程	陈涌晖 李冰 张萌	2025/12/12	已完成	2025/
10	销售行为管理: 1、输入准确的N和3T, 项目推进过程中如信息发生变化及时校准后更新CRM。 2、强化销售与商务订单管理部门及渠道的商务下单部门沟通协同, 确保渠道下单时填写的要求发货时间和销售预测的要求到货时间逻辑一致。IT上线前这个是准确率改善的关键。(IT上线后, CRM要求到货时间需要同步关联CES渠道推荐客期)	陈涌晖	2025/12/12	已完成	2025/


11	12月开始按照新的预测流程开展相关工作	张萌	2025/12/30	进行中	
12	分别针对N和T准确率11月份的数据进行具体项目细节分析，找出问题，分析根因，提供解决思路和建议，进行项目组内分享；	韩庆进，吴志伟	2025/12/11	完成	2025/
13	IT方案行动计划并推动上线: 供应链SLA进配置器和CRM 渠道CES推荐客期方案(需要与商务部门对齐并适配新流程)	张璐琦，淑娟	2025/12/11	完成	2025/
14	分批要货功能优化-下单/要货时间有问题-何青 尹小英 吴志伟 分批要货功能优化-分批清单呈现未关联具体产品、数量，只有总金额和对应产品线的总金额-张萌 立欢 韩庆进 分批要货功能优化-操作繁琐，影响效率及取值	何青、嘉乐 立欢、尹小英、吴志伟、 张萌、韩庆进	2025/12/12	完成	2026/
15	组织CES IT方案评审;探讨销管BP管理下单和要货时间的IT方案	张萌，何青	2025/12/18	完成	2026/
16	12月销售和供应链的对接和协同	张萌，立欢	2025/12/25	完成	2025/
17	OC类的订单如何做备货和要货	吴志伟，张萌，何青，立欢	2025/12/31	完成	2026/
18	推动要货时间校准和系统穿透的IT方案：明确销售在CRM中填写的要求到货日期传递到ECP，销售在ECP转订单时，需要确认该要货时间，如果实际要货与预测要求到货日期不符且超过一定范围，系统需要提醒进行变更原因的输入或者选择；销售在ECP中确认的要货时间需要传递到CES渠道下单系统供渠道填写发货日期参考，避免出现渠道随意填写情况出现。	陈涌晖，吴志伟，张萌，何青、张璐琦、淑娟	2026/1/15	进行中	

19	分批要货功能IT方案评估，设计与上线（包含OC类场景）	何青	2026/1/15	进行中
20	针对12月清单准确率数据进行复盘分享，发现问题	韩庆进	2026/1/22	进行中



1月当月承诺项目要货时间准确率，没有排除开票不考核						排除开票					
行标签	不准确		准确		个数汇总	行标签	不准确		准确		个数汇总
	个数	占比	个数	占比			个数	占比	个数	占比	
教育系统部		0%	1	100%	1	金融系统部	2	50%	2	50%	4
金融系统部	3	33%	6	67%	9	企业系统部	1	50%	1	50%	2
企业系统部	1	33%	2	67%	3	政府交通系统部	1	50%	1	50%	2
政府交通系统部	1	50%	1	50%	2	中国北区平台管理部	8	40%	12	60%	20
中国北区平台管理部	14	47%	16	53%	30	安徽区域	1	100%		0%	1
安徽区域	2	100%		0%	2	北京区域	1	33%	2	67%	3
北京区域	1	25%	3	75%	4	甘青宁区域	2	29%	5	71%	7
甘青宁区域	3	33%	6	67%	9	黑吉区域	2	100%		0%	2
黑吉区域	3	100%		0%	3	江苏区域		0%	1	100%	1
江苏区域	1	50%	1	50%	2	蒙晋区域		0%	1	100%	1
辽宁区域		0%	1	100%	1	山东区域		0%	2	100%	2
蒙晋区域		0%	1	100%	1	天津区域		0%	1	100%	1
山东区域	1	25%	3	75%	4	新疆区域	2	100%		0%	2
天津区域	1	50%	1	50%	2	中国南区平台管理部	7	33%	14	67%	21
新疆区域	2	100%		0%	2	川藏区域		0%	4	100%	4
中国南区平台管理部	10	31%	22	69%	32	福建区域		0%	1	100%	1
川藏区域		0%	5	100%	5	广东区域	4	80%	1	20%	5
福建区域		0%	1	100%	1	广西区域	1	100%		0%	1
广东区域	4	80%	1	20%	5	贵州区域		0%	1	100%	1
广西区域	1	50%	1	50%	2	湖北区域	1	50%	1	50%	2
贵州区域		0%	1	100%	1	湖南区域		0%	3	100%	3
湖北区域	2	67%	1	33%	3	上海区域	1	25%	3	75%	4
湖南区域		0%	5	100%	5	总计	19	39%	30	61%	49
江西区域		0%	1	100%	1						
上海区域	1	25%	3	75%	4						
云南区域	1	33%	2	67%	3						
浙江区域		0%	1	100%	1						
重庆区域	1	100%		0%	1						
总计	29	38%	48	62%	77						

问题分析与IT方案建议：


要货时间：

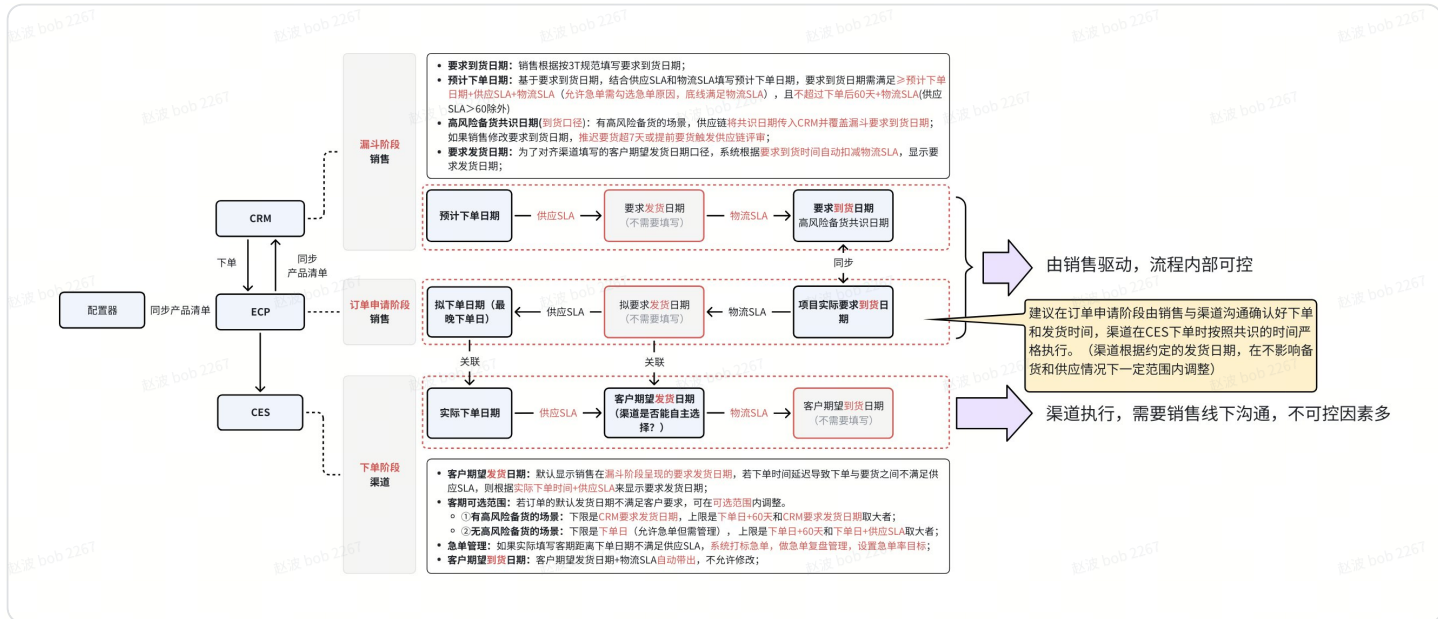

分批要货：

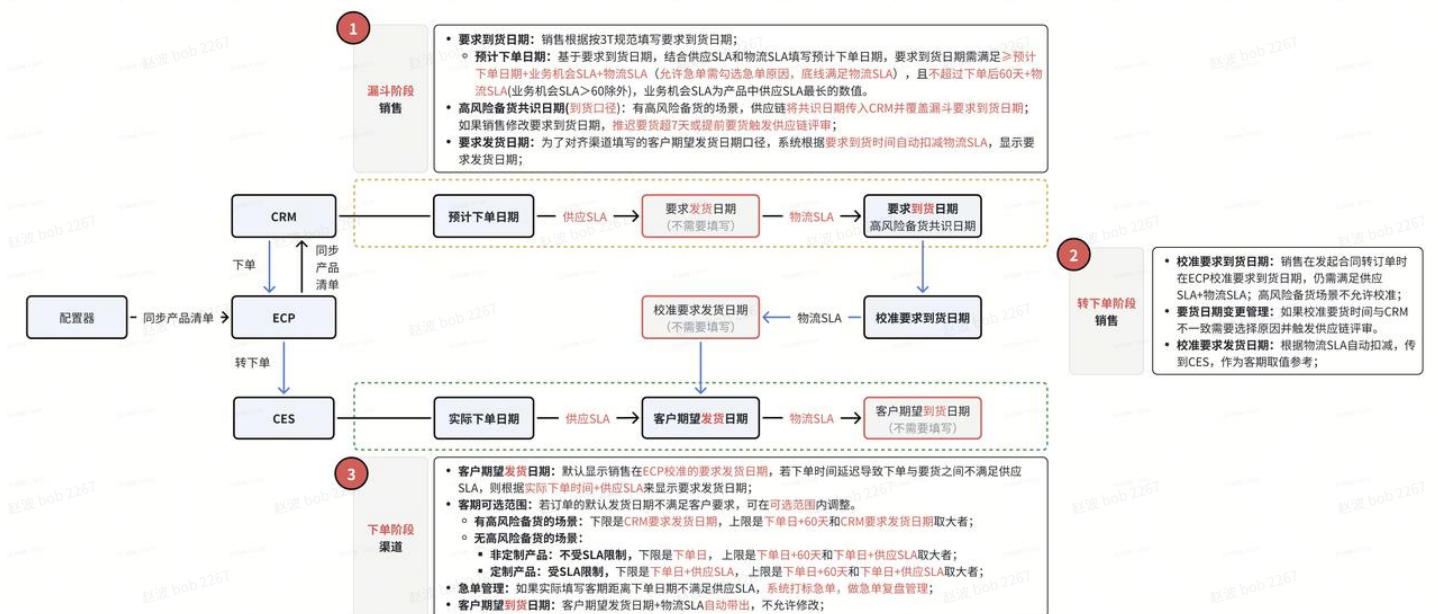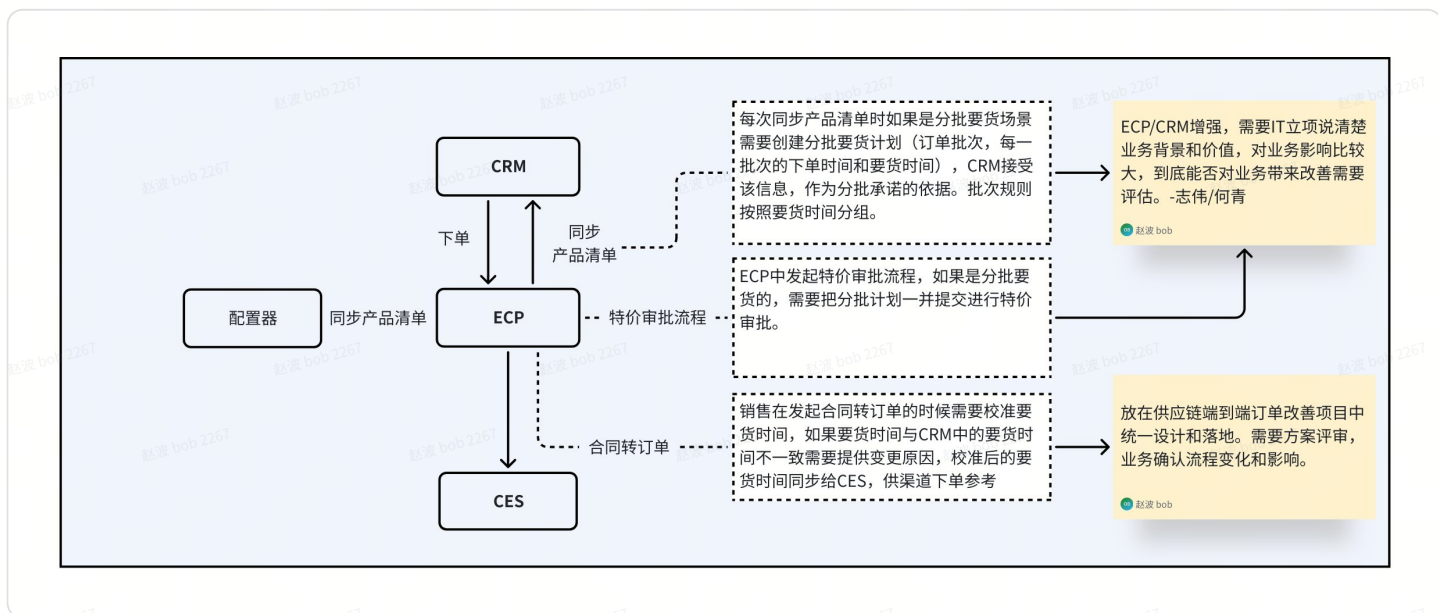

标准产品

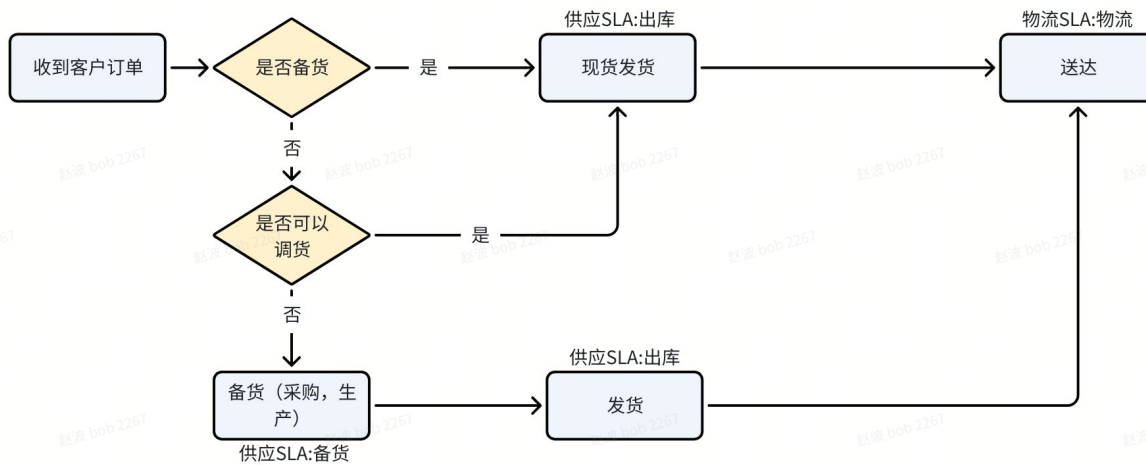

非标准产品

