

做准N和T专项沟通会-1204

会议时间：2025-12-4

会议议程：共识目标，分析11月份数据，跟踪项目进展

一、共识目标：

市场与供应链建议的目标：

指标分类	指标名称	提前期	历史平均值		2026/6/30前目标(第一阶段)			2026/6/30后期	
			24年平均	25年平均	供应链意见	市场意见	是否共识	供应链意见	市场
N	下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	当月（M+0）	72%	73%	85%	85%	是	95%	95
		隔月（M+1）	54%	57%	75%	75%	是	90%	90
		第三个月（M+2）	42%	45%	65%	65%	是	80%	80
3T	下单时间准确率（不区分备货）	当月（M+0）	89%	92%	95%	95%	是	95%	95
		隔月（M+1）	68%	63%	80%	75%	否	90%	80
		第三个月（M+2）	42%	31%	65%	45%	否	75%	65
3T	下单项目要货时间准确率（不区分备货）	当月（M+0）	47%	44%	70%	55%	否	95%	80
		隔月（M+1）	34%	30%	60%	45%	否	90%	60
		第三个月（M+2）	23%	22%	50%	35%	否	75%	50

根据上面的目标值，结合目前的实际情况，项目组建议第一阶段目标按照供应链第一阶段目标意见执行：




第一阶段：2026年6月30日前

指标分类	指标名称	提前期	历史平均值		2026/6/30目前	
			24年平均	25年平均	阶段目标	
N	下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	当月（M+0）	72%	73%	85%	
		隔月（M+1）	54%	57%	75%	
		第三个月（M+2）	42%	45%	65%	
3T	下单时间准确率（不区分备货）	当月（M+0）	89%	92%	95%	
		隔月（M+1）	68%	63%	70%	
		第三个月（M+2）	42%	31%	55%	
3T	下单项目要货时间准确率（不区分备货）	当月（M+0）	47%	44%	70%	
		隔月（M+1）	34%	30%	60%	
		第三个月（M+2）	23%	22%	50%	

结合目标，针对2025年6月-11月的数据分析：




N-下单项目清单准确率

指标	区域	提前期	年份	目标值	平均值	6月	7月
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）	M0	2025年	85%	73%	76%	71%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）	M1	2025年	75%	57%	58%	57%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	企业级网络事业群（EBG）	M2	2025年	65%	45%	48%	49%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	中国南区平台管理部	M0	2025年	85%	72%	80%	71%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	中国南区平台管理部	M1	2025年	75%	56%	57%	56%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	中国南区平台管理部	M2	2025年	65%	43%	47%	45%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	中国北区平台管理部	M0	2025年	85%	73%	73%	71%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	中国北区平台管理部	M1	2025年	75%	58%	59%	57%
下单项目清单准确率（不区分备货）-产品权重	中国北区平台管理部	M2	2025年	65%	47%	49%	51%

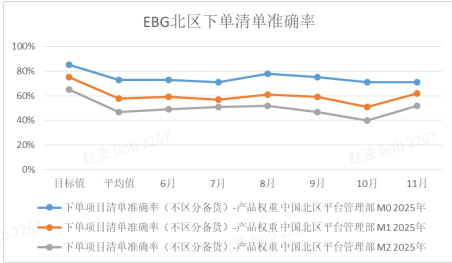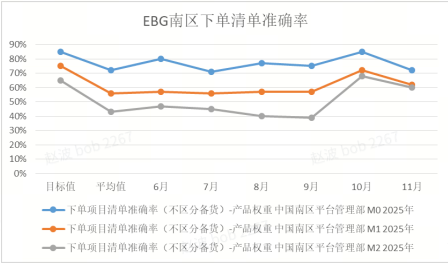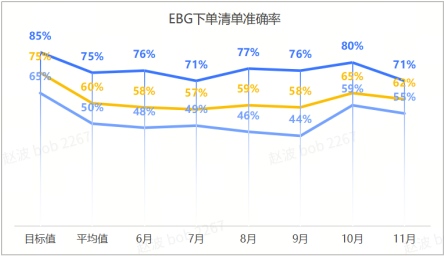




3T-下单时间准确率：

指标	区域	提前期	年份	目标值	平均值	6月	7月	8月
下单时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M0	2025年	95%	88%	91%	86%	89%
下单时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M1	2025年	70%	65%	75%	65%	66%
下单时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M2	2025年	55%	45%	66%	30%	56%
下单时间准确率（不区分备货）	中国南区平台管理部	M0	2025年	95%	86%	90%	84%	88%
下单时间准确率（不区分备货）	中国南区平台管理部	M1	2025年	70%	64%	70%	62%	65%
下单时间准确率（不区分备货）	中国南区平台管理部	M2	2025年	55%	46%	63%	40%	59%
下单时间准确率（不区分备货）	中国北区平台管理部	M0	2025年	95%	91%	92%	89%	90%
下单时间准确率（不区分备货）	中国北区平台管理部	M1	2025年	70%	64%	80%	67%	68%
下单时间准确率（不区分备货）	中国北区平台管理部	M2	2025年	55%	43%	68%	21%	53%

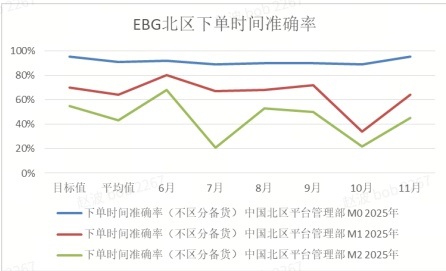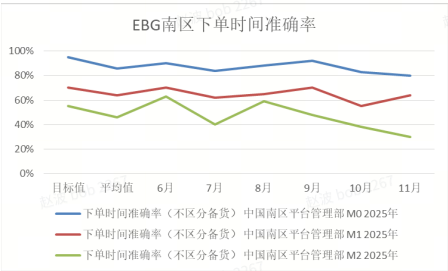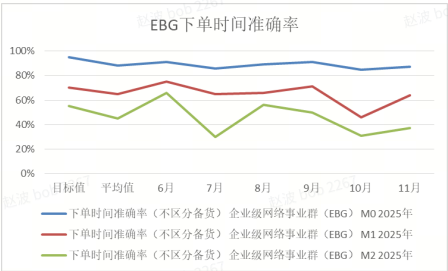

3T-要货时间准确率：

指标	区域	提前期	年份	目标值	平均值	6月	7月	8月
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M0	2025年	70%	45%	38%	46%	50%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M1	2025年	60%	33%	31%	32%	32%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	企业级网络事业群（EBG）	M2	2025年	50%	29%	25%	33%	39%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	中国南区平台管理部	M0	2025年	70%	47%	38%	52%	52%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	中国南区平台管理部	M1	2025年	60%	34%	33%	36%	32%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	中国南区平台管理部	M2	2025年	50%	32%	24%	38%	41%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	中国北区平台管理部	M0	2025年	70%	43%	39%	40%	47%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	中国北区平台管理部	M1	2025年	60%	32%	29%	28%	32%
下单项目要货时间准确率（不区分备货）	中国北区平台管理部	M2	2025年	50%	27%	25%	27%	36%

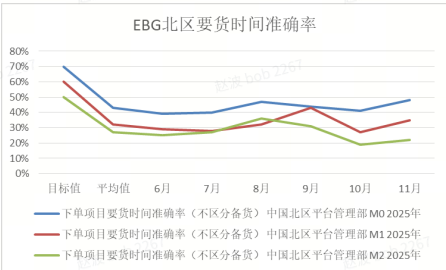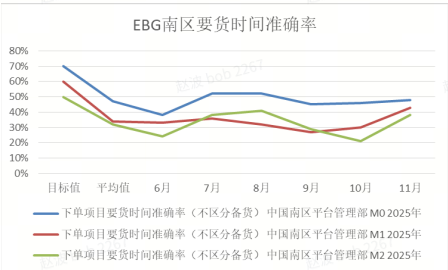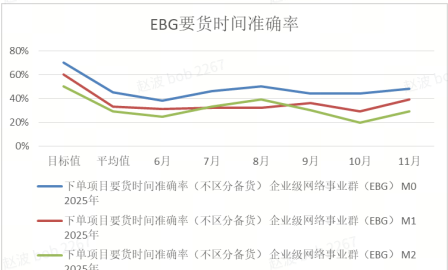

★ 数据分析：

N-下单项目清单准确率：

- 1、M0：25年6到11月准确率平均75%，离共识目标85%有一定差距（-10%）
- 2、M1：25年6到11月准确率平均60%，离共识目标75%有一定差距（-15%）
- 3、M2：25年6到11月准确率平均50%，离共识目标65%有一定差距（-15%）

三个指标均未达标，并且11月数据相比10月数据有下降，需要分析具体的数据找到原因。南区有下降趋势，北区数据持平。

3T-下单时间准确率：

- 1、M0：25年6到11月准确率平均88%，离第一阶段最高目标95%有一定差距（-7%），北区比南区做的好（91% vs. 86%）。
- 2、M1：25年6到11月准确率平均65%，离第一阶段最高目标80%有一定差距（-15%），北区与南区数据相同（64%）
- 3、M2：25年6到11月准确率平均45%，离第一阶段最高目标65%有一定差距（-20%），南区比北区做的好（46% VS. 43%）
- 4、当月M0数据显示，南区有下降趋势，北区有改善。

3T-要货时间准确率：

- 1、M0：25年6到11月准确率平均45%，离第一阶段最高目标70%有一定差距（-25%），南区比北区做的更好（47% vs. 43%）。
- 2、M1：25年6到11月准确率平均33%，离第一阶段最高目标60%有一定差距（-27%），南区比北区做的更好（34% vs. 32%）
- 3、M2：25年6到11月准确率平均29%，离第一阶段最高目标50%有一定差距（-21%），南区比北区做的好（32% VS. 27%）
- 4、南区，北区均有改善趋势，变化不明显，整体准确率偏低。

项目组核心成员及职责：

项目职责	负责人	角色	职责
T目标达成总负责人	陈涌晖	南区平台负责人	对做准T的总责任人，确保方案有效，执行到位，目标达成
N目标达成总负责人	蔡聪	售前负责人	对做准N的总责任人，确保方案有效，执行到位，目标达成
N方案负责人	韩庆进	山东区域售前负责人	做准N的业务方案负责人，通过业务数据复盘分析问题，找到有效解法

			支撑N的准确率目标达成。 （关注做不准到做准的问题）
T方案负责人	吴志伟	上海区域经理	做准3T的业务方案负责人，通过业务数据复盘分析问题，找到有效解法支撑3T的准确率目标达成。 （关注做不准到做准的问题）
MO流程推进与落地N和T方案	曹曦	政府系统部系统总	负责项目组对于做准N和T的流程落地，解决流程执行率和执行质量，确保有效方案落地。 （关注能做准但是没有做准的问题）
销管团队支持-销售预测	李冰，张萌	销管团队	负责销售预测流程的制定，发布与执行。 市场侧目标达成跟踪与闭环 （关注能做准但是没有做准的问题）
供应链团队支持	张璐琦，赵立欢，王淑娟	供应链市场计划团队	供应链侧质量要求和标准，确保方案有效支撑供应链相关指标 供应链侧IT方案设计与推动-CES推荐客期，分批要货功能优化等
自工序团队支持	翁石强	质量管理部	设计与精进N和T的质量标准和良品条件； 通过数据和案例分析，找到共性问题和解法，并给项目组提出指导和建议
PMO-项目组织与推进	沙书立，赵波	流程管理	管理专项计划，组织协调与跟进关键行动项，推动项目进展。

从目前的数据来看，各个指标均未发生明显改善，且都未达标，EBG领导层非常重视，希望各位参与项目组的骨干成员进一步抓紧推动指标改善，达到业务目标。

二、分析问题：

基于上面的数据，我们离目标还有一定差距，希望各位负责人安排组织数据分析，找到问题和差距的具体根因，并在项目组范围分享，行动项：

行动项	负责人	完成时间	相关材料
-----	-----	------	------

N的准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。	蔡聪	2025-12-14	
3T准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。 开标时间准确率复盘-张萌/嘉乐 下单时间准确率可以分享销售隔月预测复盘结果 要货时间准确率复盘可以做完行动项以后再看--张萌，璐琦一起核对，上BI看板对齐取值，看板建立后，第一时间对齐指标达成率，同步专项组；	陈涌晖	2025-12-14	

三、行动项及进度跟踪：

行动项	负责人	计划时间	状态	完成时间	进度描述
要货时间准确性判断标准确定和共识-BI看板	张璐琦，吴志伟、张萌	2025-11-28	完成	2025-11-28	达成共识，按照15天偏离来计算和判断要货时间准确性
销售预测流程管理决策,要求到货时间管起来,M-2管起来;决策是否管理,具体管理办法和流程 分析过程并同步	李冰，张萌	2025-11-28	完成	2025-11-28	决定通过销售预测流程把下单和要货都管起来，并已经输出第一版管理流程和机制： 国滚动3个月预测管理机制-市场线版本
IT方案：针对下单和要货时间IT优化方案共识,包括:前端产品方案配置中显示SLA;分批要货方案优化;CES渠道要货时间与推荐客期管理;	张璐琦	2025-11-28	完成	2025-11-28	璐琦跟进了IT方案和需求，仍需要与相关业务部门确认影响和有效性之后来制定具体的推进计划。 下周评审，共识后确认执行范围及执行路径；
MO流程植入供应链协同规则,推动试点区域运行,同时迭代优化现有流程	曹曦	2025-12-29	进行中		2025-11-28：确定了试点范围和方案，待目标共识后推进区域宣贯和开始试点工作。

针对现有N和3T的方案探索新解法	韩庆进， 吴志伟	2025-12-31	进行中		先分析历史数据，针对性给出解决优化建议和方案。
把T的良品条件进一步精进	沙书立， 翁石强	2025-12-31	进行中		针对特殊项目EPC等进行进一步深度分析，看看这类特殊项目是否存在普遍问题可以供项目组参考。
推动销售预测流程的评审和发布；-BI看板	陈涌晖 李冰 张萌	2025-12-12前			全部发布执行
销售行为管理： 1、输入准确的N和3T，项目推进过程中如信息发生变化及时校准后更新CRM。 2、强化销售与商务订单管理部门及渠道的商务下单部门沟通协同，确保渠道下单时填写的 要求发货时间 和销售预测的 要求到货时间 逻辑一致。 IT上线前这个是准确率改善的关键。（IT上线后，CRM要求到货时间需要同步关联CES渠道推荐客期）	陈涌晖	2025-12-12			
销管团队组织区域培训新流程,并在12月开始按照新的预测流程开展相关工作	张萌	2025-12-30			
分别针对N和T准确率11月份的数据进行具体项目细节分析，找出问题，分析根因，提供解决思路和建议，进行项目组内分享；	韩庆进， 吴志伟	2025-12-11			
IT方案行动计划并推动上线： 供应链SLA进配置器和CRM 渠道CES推荐客期方案(是否需要引入商务部门进入项目组？商务与渠道沟通下单&要货时间需要有依据和数据支持。)	张璐琦， 淑娟	2025-12-11			
					何青牵头

分批要货功能优化-下单/要货时间有问题-何青 尹小英 吴志伟	何青、嘉乐	2025-12-12			ECP关单规则
分批要货功能优化-分批清单呈现未关联具体产品、数量，只有总金额和对应产品线的总金额-张萌 立欢 韩庆进	立欢、尹小英、吴志伟、张萌、韩庆进				54. 【已上线】ECP自动关单逻辑调整 【需求背景】自动关单优化 范围：特价下单、协议价下单、虚特价下单 规则： 场景1：特价促销时下单 一个业务机会结束，当前结果的提报时下单对应的净销售额之和大于等于最新一次提报金额的5%则自动关单。 场景2：协议价下单 下单时按关单。 场景3：虚特价：净折扣15%及以上/净费用>+4.9分13%折扣以上直接特价下单。虚特价下单（提报后） 下单时按关单。 场景4：虚特价分批下单 下单时按关单。

会议纪要：

会议纪要							
会议时间	2025/12/4	会议地点	飞书线上会议	参会人员	曹曦、陈涌晖、蔡聪、李冰、张璐琦、韩庆进		
会议议程	共识第一阶段（2026年6月30日）目标						
	6-11月数据汇报与分析，明确各指标当前存在的问题						
	共识行动项，确定责任人，并确定跟进计划						
行动计划							
序号	行动项			负责人	计划跟进时间	状态	完成
1	要货时间准确性判断标准确定和共识-BI看板			张璐琦，吴志伟、张萌	2025/11/28	已完成	2025/
2	销售预测流程管理决策,要求到货时间管起来,M-2管起来;决策是否管理,具体管理办法和流程			李冰，张萌	2025/11/28	已完成	2025/
3	IT方案跟进：针对下单和要货时间IT优化方案共识,包括:前端产品方案配置中显示SLA;分批要货方案优化;CES渠道要货时间与推荐客期管理;			张璐琦	2025/11/28	已完成	2025/
4	N的准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。			蔡聪	2025/12/14		
5	3T准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。 开标时间准确率复盘-张萌/佳乐 下单时间准确率可以分享销售隔月预测复盘结果 要货时间准确率复盘可以做完行动项以后再看--张萌，璐琦一起核对，上BI看板对齐取值，看板建立后，第一时间对齐指标达成率，同步专项组；			陈涌晖	2025/12/14		
6	MO流程植入供应链协同规则,推动试点区域运行,同时迭代优化现有流程			曹曦	2025/12/29		

7	把T的良品条件进一步精进	沙书立，翁石强	2025/12/31		
8	推动销售预测流程的评审和发布；销管团队组织区域培训新流程	陈涌晖 李冰 张萌	2025/12/12		
9	销售行为管理： 1、输入准确的N和3T，项目推进过程中如信息发生变化及时校准后更新CRM。 2、强化销售与商务订单管理部门及渠道的商务下单部门沟通协同，确保渠道下单时填写的要求发货时间和销售预测的要求到货时间逻辑一致。IT上线前这个是准确率改善的关键。（IT上线后，CRM要求到货时间需要同步关联CES渠道推荐客期）	陈涌晖	2025/12/12		
10	12月开始按照新的预测流程开展相关工作	张萌	2025/12/30		
11	分别针对N和T准确率11月份的数据进行具体项目细节分析，找出问题，分析根因，提供解决思路和建议，进行项目组内分享；	韩庆进，吴志伟	2025/12/11		
12	IT方案行动计划并推动上线： 供应链SLA进配置器和CRM 渠道CES推荐客期方案(需要与商务部门对齐并适配新流程)	张璐琦，淑娟	2025/12/11		
13	分批要货功能优化-下单/要货时间有问题-何青 尹小英 吴志伟 分批要货功能优化-分批清单呈现未关联具体产品、数量，只有总金额和对应产品线的总金额-张萌 立欢 韩庆进 分批要货功能优化-操作繁琐，影响效率及取值	何青、嘉乐 立欢、尹小英、吴志伟、 张萌、韩庆进	2025/12/12		
