


做准N和T专项沟通会-1218

一、关键行动项进度拉通：

会议纪要						
会议时间	2025/12/18	会议地点	飞书线上会议	参会人员	曹曦、陈涌晖、蔡聪、李冰、	
会议议程	再次明确项目组关键人员职责					
	关键行动项进展拉通					
	N历史数据复盘					
行动计划						
序号	行动项		负责人	计划跟进时间	状态	完成
1	要货时间准确性判断标准确定和共识-BI看板		张璐琦，吴志伟、张萌	2025/11/28	已完成	2025/
2	销售预测流程管理决策,要求到货时间管起来,M-2管起来;决策是否管理,具体管理办法和流程		李冰，张萌	2025/11/28	已完成	2025/
3	IT方案跟进：针对下单和要货时间IT优化方案共识,包括:前端产品方案配置中显示SLA;分批要货方案优化;CES渠道要货时间与推荐客期管理;		张璐琦	2025/11/28	已完成	2025/
4	N的准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。		蔡聪	2025/12/14	已完成	2025/
5	3T准确率：组织做的好的和做的不好的区域进行经验分享和问题复盘分析。 开标时间准确率复盘-张萌/许佳乐 下单时间准确率可以分享销售隔月预测复盘结果 要货时间准确率复盘可以做完行动项以后再看--张萌，璐琦一起核对，上BI看板对齐取值，看板建立后，第一时间对齐指标达成率，同步专项组；		陈涌晖	2025/12/14	已完成	2025/
6	MO流程植入供应链协同规则,推动试点区域运行,同时迭代优化现有流程		曹曦	2025/12/29	进行中	
7	提升N过程中的准确性和及时更新：待明确活动跟进接口人，MO流程执行过程中的解决方案评审和标前评审会由技术把关人（BU/BG:节点经理，区域：技术经理）来统一做分析和系统留痕		蔡聪	2025/12/25		
8	把T的良品条件进一步精进		沙书立，翁石强	2025/12/31	进行中	
9	推动销售预测流程的评审和发布；组织区域培训新流程		陈涌晖 李冰 张萌	2025/12/12	已完成	2025/
	销售预测流程					

10	销售行为管理： 1、输入准确的N和3T，项目推进过程中如信息发生变化及时校准后更新CRM。 2、强化销售与商务订单管理部门及渠道的商务下单部门沟通协同，确保渠道下单时填写的要求发货时间和销售预测的要求到货时间逻辑一致。IT上线前这个是准确率改善的关键。（IT上线后，CRM要求到货时间需要同步关联CES渠道推荐客期）	陈涌晖	2025/12/12	已完成	2025/
11	12月开始按照新的预测流程开展相关工作	张萌	2025/12/30	进行中	
12	分别针对N和T准确率11月份的数据进行具体项目细节分析，找出问题，分析根因，提供解决思路和建议，进行项目组内分享；	韩庆进，吴志伟	2025/12/11	部分完成	2025/
13	IT方案行动计划并推动上线： 供应链SLA进配置器和CRM 渠道CES推荐客期方案(需要与商务部门对齐并适配新流程)	张璐琦，淑娟	2025/12/11	进行中	
14	分批要货功能优化-下单/要货时间有问题-何青 尹小英 吴志伟 分批要货功能优化-分批清单呈现未关联具体产品、数量，只有总金额和对应产品线的总金额-张萌 立欢 韩庆进 分批要货功能优化-操作繁琐，影响效率及取值	何青、嘉乐 立欢、尹小英、吴志伟、张萌、韩庆进	2025/12/12	进行中	
15	组织CES IT方案评审;探讨销管BP管理下单和要货时间的IT方案	张萌，何青	2025/12/18	进行中	
16	12月销售和供应链的对接和协同	张萌，立欢	2025/12/25		

二、要货时间管理方案建议：

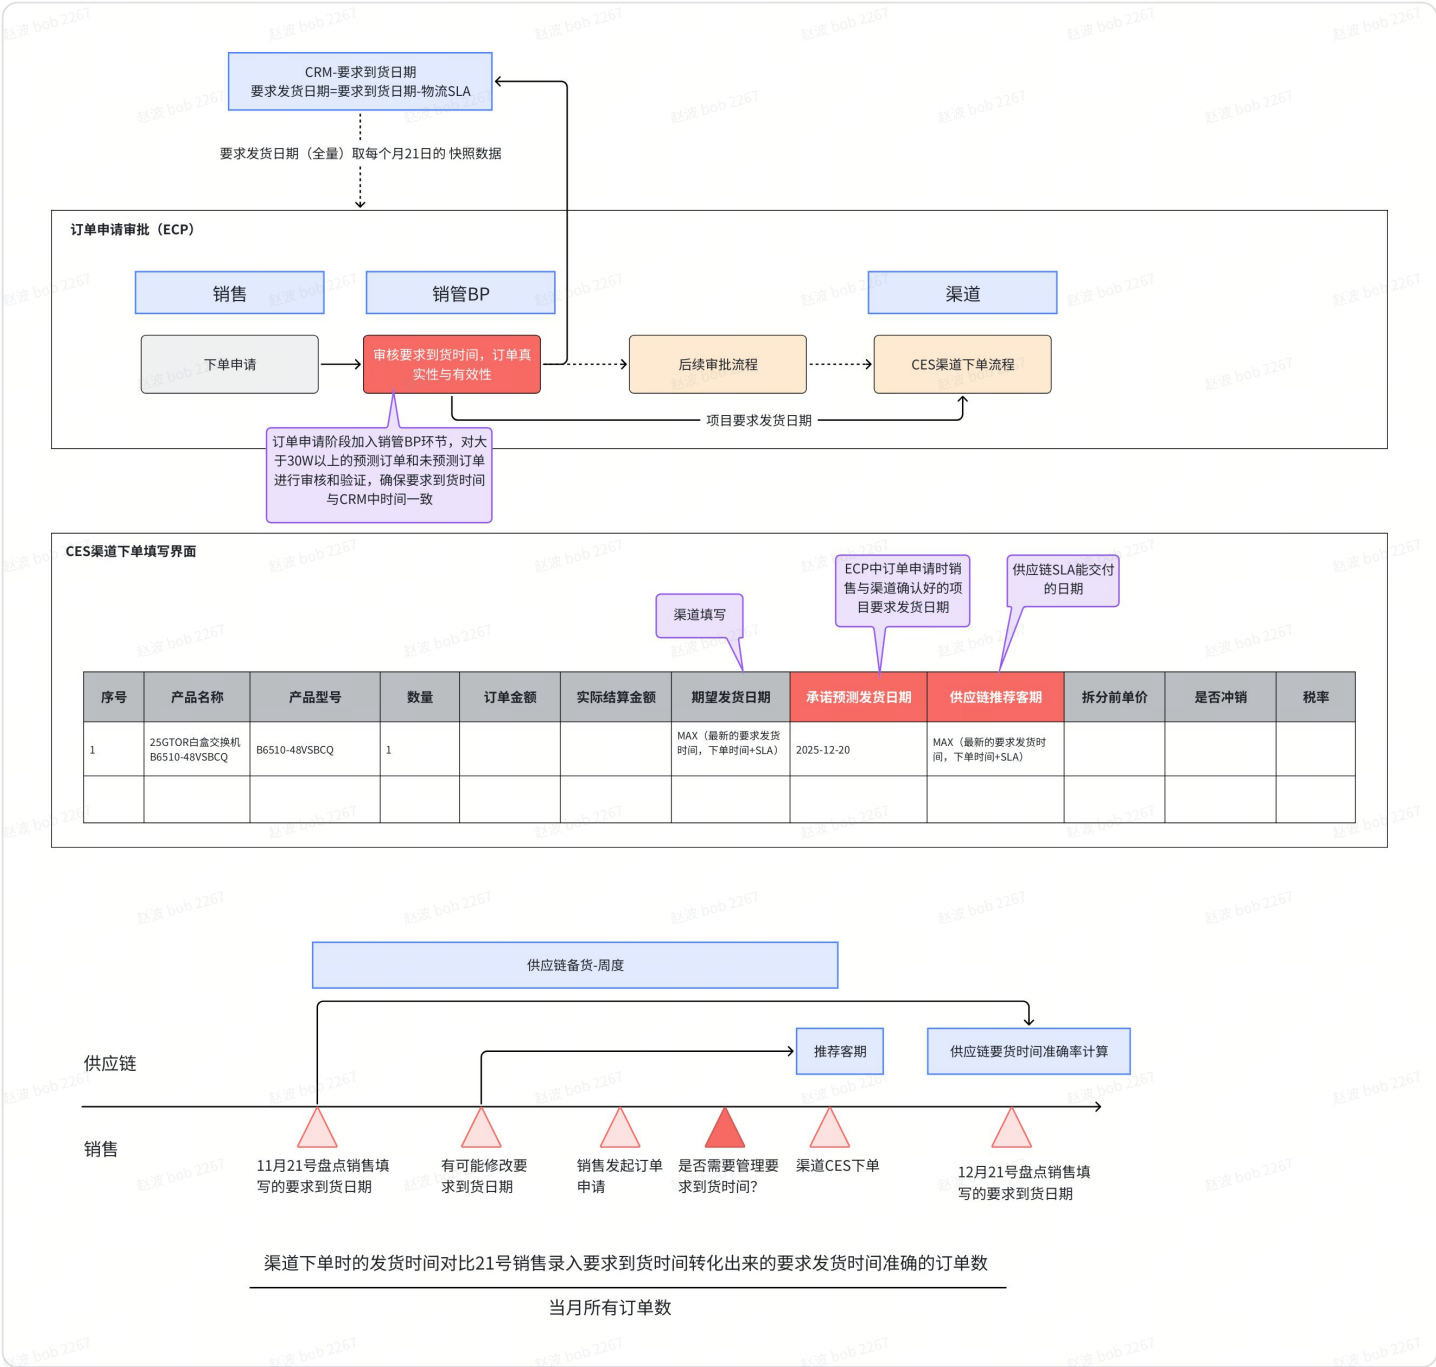

11月份N的准确性复盘	复盘范围和内容	发现的核心问题	对应举措
	本次复盘聚焦重庆、江西、山东、河北四个11月下单项目清单准确率30%以下的区域，重点核查M0，M1，M2阶段CRM报备清单与实际下单清单的匹配情况。	1. 部分区域未按流程完成漏斗内项目清单自评与更新，导致清单偏差； 2. 分批下单、混合清单（特价+非特价）及虚拟退换货数据统计不规范； 3. 客户需求变更、渠道商谈判调整、预算变动等外部因素引发清单调整，且未及时同步更新CRM。	1. 对月度排名后五的区域开展单点业务对话，持续靠后区域由专项组进驻辅导； 2. 推进分批下单与混合清单问题的解决，核对虚拟退换货数据统计方案； 3. 强化售前清单可信度自评与销售CRM更新的流程管控，要求及时同步客户需求、项目配置等变更信息，提升清单准确率。

