

EBG BUSINESS PROCESS

EBG MO商机 管理流程

MO流程各专项组及系统部立项项目输入拉通

26年GTM、重客、系统部 重点关注项目立项管理要求

全面提升商机转化质量与效率 · 全生命周期管理体系

2026

EBG事业部
商机管理流程项目组

2026年1月

会议议程

01

立项管理变革背景与核心变化

从单一金额标准到多维度评估体系的演进逻辑

02

立项标准与分层分级机制

BG级/BU级/区域级/一般项目的四级分类体系详解

03

MO流程运转机制与关键节点

六大关键节点、责任人、时间要求与业务目标

04

各角色职责与协作要求

GTM/重客/系统部项目清单提报要求与协作机制

05

区域周例会落地机制

会前准备、会中跟进、会后执行的完整闭环

06

系统操作指南与执行检查

CRM系统操作、考核机制与下一步执行要求

立项管理变革:从单一金额到多维度标准

✕ 原有标准

单一金额判断

仅根据项目预估金额是否达到**200万门槛值**来确定是否发起立项

缺乏综合评估

缺乏对客户战略重要性、竞争态势、解决方案重要级复杂度等关键维度的综合评估

资源错配风险

易导致战略资源错配

✔ 新标准核心变化

金额标准保留

保留**200万+/500万+/800万+**的金额门槛作为基础判断维度

负责人指定项目

核心变革：GTM负责人、重客负责人、系统总年初指定的重点项目清单,无论金额大小均需立项

客户维度强制立项

重客立项规则从默认所有金额必须立项,修订为**大于80W立项**,确保资源投入有效性

🔑 变革驱动力

提升管理精准性

前置识别战略级项目

优化资源配置

确保核心资源投入关键战场

强化协同作战

通过立项机制组建项目铁三角

★ 特殊项目识别


可由系统部和平台管理部直接勾选的立项商机,如部门级/系统部解决方案前三单、行业类大金额的框采、行业EC&DC类项目、区域直签项目等

立项标准与分层分级机制

BG级 最高级别 金额维度 重客200w+ 非重客800w+ 特殊项目 GTM/重客/系统总年初指定项目 (BG级) 介入层级 平台总、售前总、客户体验部总经理、系统总、区域铁三角/项目铁三角 KCP要求 全KCP 客户维度 重客重点项目必须立项,确保战略客户全流程管理	BU级 重要级别 金额维度 重客80-200W 非重客500w+ 特殊项目 GTM/重客/系统总年初指定项目 (BU级) 介入层级 系统总、行业营销拓展负责人、区域铁三角、项目铁三角 KCP要求 全KCP 竞争程度 小项目不立项,避免资源浪费	区域级 常规级别 金额维度 漏斗内预估下单金额200w+ 特殊项目 直签项目 负责人 区域铁三角、行业经理 KCP要求 全KCP 金额维度 重客:80W+/200W+ 非重客:200w+/500w+/800w+	一般项目 基础级别 金额维度 未达立项标准 特殊项目 满足立项条件但是决策不立项项目 负责人 销售经理 KCP要求 仅标前评审 特殊立项 系统部/平台管理部直接勾选的项目
---	---	---	---

PROCESS OVERVIEW

MO商机管理流程概览

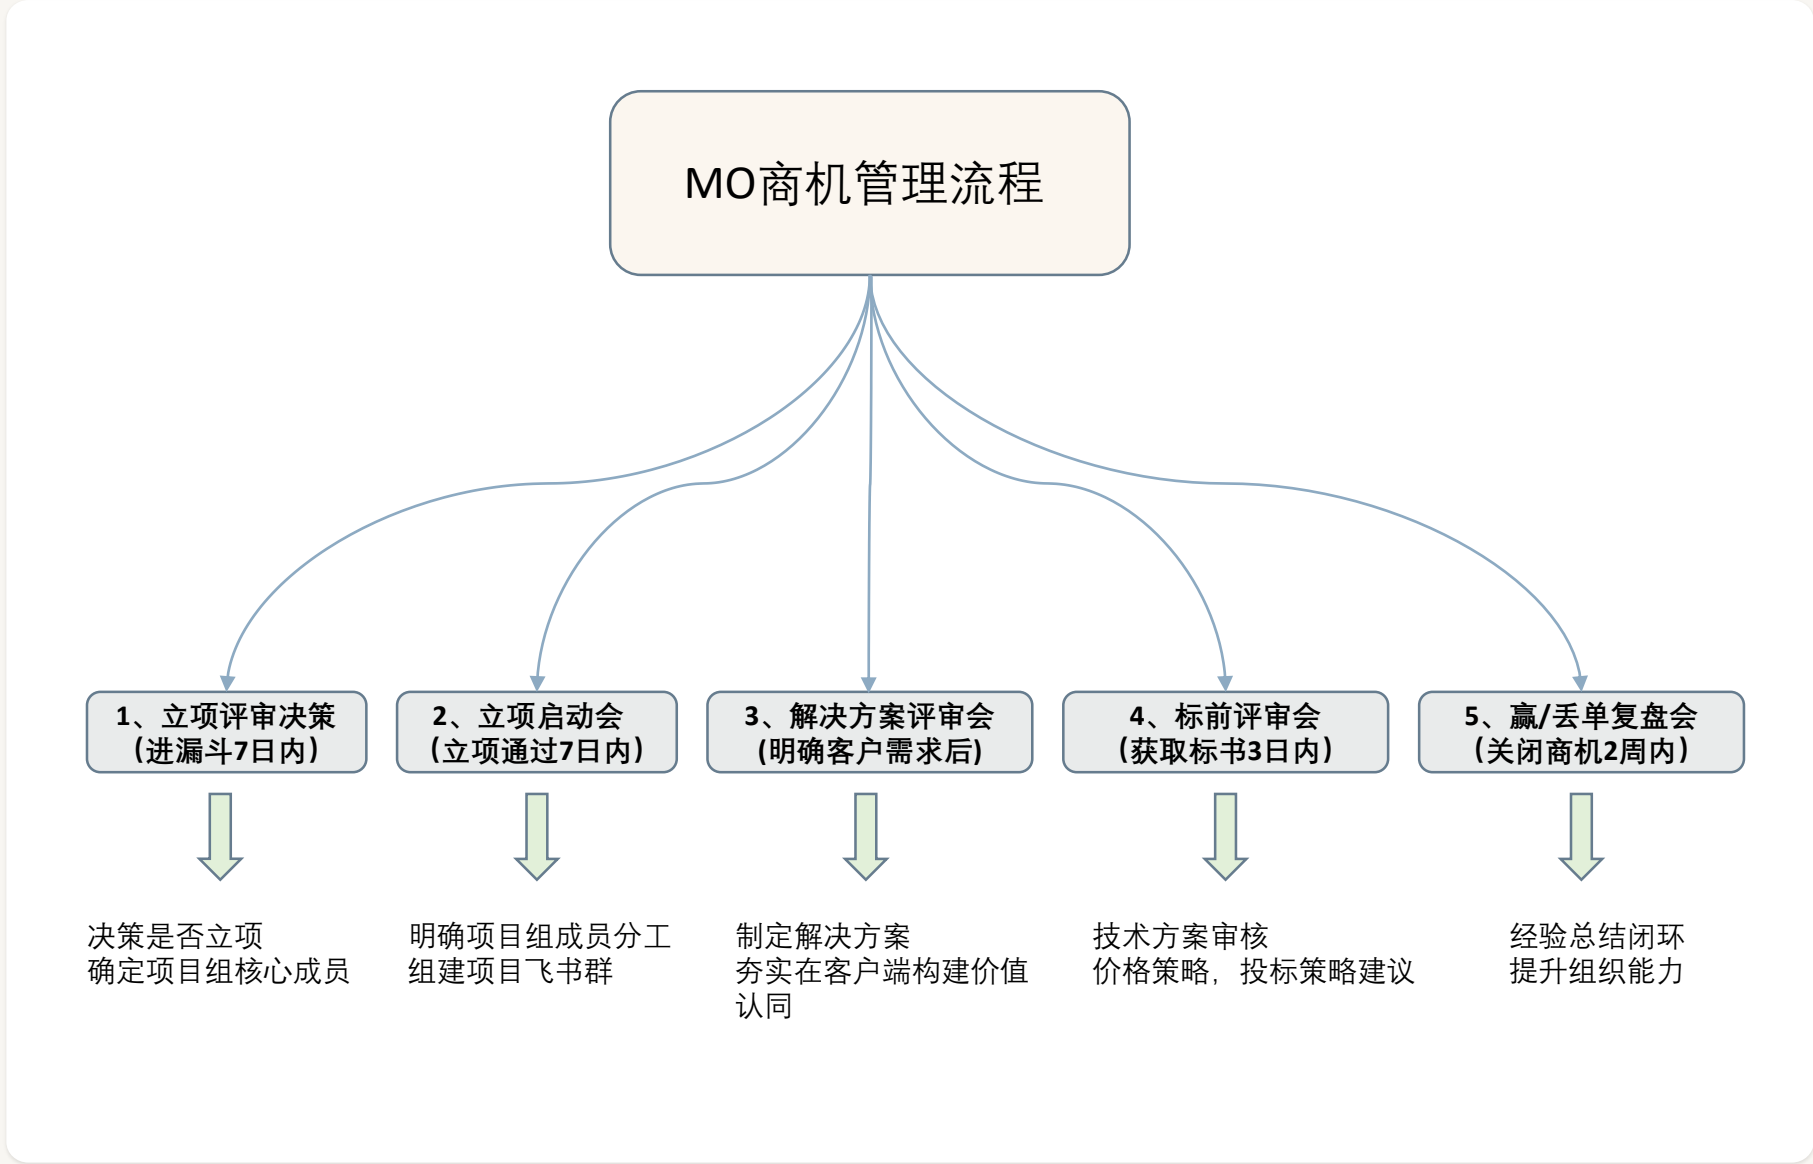

🕒 时间要求

1 进入漏斗7天内完成立项决策

2 获取标书3天内组织标前评审

3 商机关闭2周内完成复盘

🎯 执行目标

立项启动率80%

7天内完成立项决策

解决方案评审率100%

所有立项项目必须执行

标前评审执行率80%

3天内组织标前评审

丢/赢单复盘率100%

2周内完成经验总结

关键节点执行要求与责任人 (1/2)

01

立项评审决策

第一关键节点



责任人

销售经理



时间要求

进入漏斗**7天内**发起立项评审决策



执行内容

决策是否立项及确定项目组成员,每周销售例会呈现立项项目池



运转机制

销管BP通过周例会看板追踪,区域经理督促执行

02

立项启动会

第二关键节点



责任人

项目经理



时间要求

立项评审通过**7天内**召开第一次项目分析会



执行内容

明确项目组成员及分工,组建项目飞书群,应用至QBC季度考核



考核机制

每个未执行周关键任务次数扣减**0.5分QBC分值**

关键节点执行要求与责任人 (2/2)

03

解决方案评审会

第三关键节点

👤 责任人

技术负责人

🕒 执行时机

明确客户需求后及时制定解决方案并发起评审

📋 执行内容

及时刷新方案保证有效性,夯实在客户端构建方案价值认可

🎯 目标要求

立项项目解决方案评审率**100%**,标前评审会前必须完成

04

标前评审会

第四关键节点

👤 责任人

客户关系负责人

🕒 时间要求

获取正式标书**3天内**组织开展标前评审会

📋 执行内容

技术负责人给出技术方案审核、价格策略、投标策略建议

👁️ 监控机制

销管BP提前30天提醒跟踪,周例会呈现30日内开标项目清单

05

赢/丢单复盘会

第五关键节点 · 经验总结闭环

责任人	时间要求	目标
项目经理	关闭活动商机2周内	100%

GTM、重客、系统部项目清单提报要求

! 核心要求

- 年初指定立项项目范围

GTM负责人、重客负责人、系统总需在年初明确指定本年度重点关注项目清单
- CRM中批量立项并跟踪推进

MO流程项目组协调IT统一在系统中批量立项,各负责人全生命周期管理

☰ 项目清单内容

业务机会编码	业务机会名称
预估下单金额	预计要货时间
预计下单时间	预计开标时间
竞争态势	是否重客

核心目标:各负责人需在年初一次性提供完整清单,MO流程项目组协调IT批量导入CRM系统立项,实现全生命周期管理

👥 立项组织信息

- 项目经理

项目整体负责人
- 客户关系负责人

机会所有人/销售
- 技术负责人

解决方案技术负责人
- 客户体验负责人

客户体验保障负责人
- 销管BP

销售管理BP

📅 输出时间节点

- 年初: 提交年度重点项目清单
- 季度更新: 根据业务变化动态调整
- 月度补充: 新增战略项目及时提报
- 周度跟进: 区域例会同步项目进展

各角色主要职责与协作机制

销售/业务机会所有人

- ✓ 填写MANT信息:登录CRM填写商机关键信息
- ✓ 3T时间:准确填写预计要货、下单、开标时间
- ✓ 发起立项申请:对漏斗内满足立项条件的商机自动发起
- ✓ 项目文档:下载模板创建项目过程管理材料并上传飞书

项目经理

- ✓ 立项启动会:7天内组织召开第一次项目分析会
- ✓ 项目分析会:组织召开不同阶段的项目分析会(价值主张、招标策略等)
- ✓ 赢丢单复盘:关闭商机2周内开展赢丢单复盘经验总结
- ✓ CRM留痕:在CRM各模块留痕并完成飞书项目文档填写上传

区域经理/系统总/主管VP

- ✓ 审批决策:审批决策是否立项通过(区域级/BU级/BG级)
- ✓ 确认项目组:确认项目经理及铁三角人员准确无误
- ✓ 漏斗审批:核实商机信息,交叉验证后审批进漏斗申请
- ✓ 分级分层:根据项目分级分层要求对项目是否立项进行填写

技术把关负责人

- ✓ 解决方案评审:明确价值主张或建议项目铁三角明确需求
- ✓ 标前分析会:给出技术方案审核、价格策略、投标策略建议
- ✓ 夯实价值:夯实在客户端构建方案价值认可,愿景重构
- ✓ 策略建议:项目铁三角根据技术负责人输入进行修订完善

销管BP

- ✓ 周例会看板准备
- ✓ 数据追踪监控
- ✓ 任务提醒跟催
- ✓ CRM系统留痕

协作机制

区域铁三角

区域经理 + 行业经理 + 项目铁三角

项目铁三角

销售 + 技术 + 客户关系负责人

协同目标

通过明确的角色分工和协作机制,确保MO流程各关键节点高效执行,提升商机转化质量和效率

区域周例会落地机制

会前准备

销售准备

整理名下商机数据,分类梳理,搞清楚所处阶段

销管BP准备

准备上周异常数据、本周需提醒执行的数据,发会议通知

区域经理准备

明确需重点讨论的异常项目及需提醒执行关键流程活动的项目

会中要求

每周1次

固定时间

反馈与跟进

商机所有人反馈项目情况、异常活动执行情况及下一步计划,销管BP实时记录更新

系统操作

根据会议要求在CRM及飞书中执行相应操作,确保流程闭环

会后执行

行动计划与任务

异常数据责任人认领行动,销管BP跟催提醒,明确截止时间

持续跟进

销管BP对进行中项目做任务提醒,活动责任人及时跟进

召开频次

1

次/周

固定时间召开
确保全员参与

周例会呈现的 四大数据看板

1 立项申请进展

2 立项启动会进展

3 标前分析会进展

4 赢丢单复盘会进展

系统操作指南与落地执行检查

CRM系统关键操作

- 1

提交漏斗审批

填写MANT信息、3T时间、项目分级分层,区域经理审批
- 2

自动立项审批提交

系统根据项目级别自动发起立项决策申请,自动发送决策人
- 3

立项启动会

下载模板创建项目文档、上传飞书、填写项目基本信息
- 4

评审会留痕

解决方案评审会/标前分析会/赢丢单复盘会CRM留痕

执行检查机制

- 📅

考核周期

月度、季度进行关键任务执行看板检查
- ★

考核应用

应用至QBC季度考核打分,直接应用
- 扣分标准

每个未执行周关键任务次数扣减0.5分QBC分值

通过系统操作的标准化和执行检查机制的落地,确保MO流程各关键节点有效执行,持续提升商机管理能力

特殊场景说明

- 场景1

满足立项标准的区域级/BU级/BG级项目修改"是否发起立项申请"为"否",需填写具体不立项原因
- 场景2

不满足立项初始标准的一般项目想要立项,需调整"分级分层"为区域级/BU级/BG级,同时"是否发起立项申请"填写为"是"

CRM访问路径

- 1

登录CRM
- 2

智能分析
- 3

公共空间
- 4

MO流程看板

TOGETHER WE GO FURTHER

携手并进 推动MO流程高质量落地

全生命周期管理 · 共创高质量商机转化

1

年初提报

GTM/重客/系统部负责人按要求提供重点项目清单

2

系统立项

MO项目组协调IT批量导入CRM统一立项

3

全周期管理

通过周例会机制持续追踪推进,提升转化效率

严格执行MO流程各关键节点 · 共同提升商机转化质量和效率

如有疑问,请联系MO流程项目组

当前执行情况分析与下一步要求

执行数据(截至9月25日)

大项目启动会 23.9%

解决方案评审会 1.8%

标前分析会 3.2%

存在的主要问题

整体执行率偏低

大项目启动会、解决方案评审会、标前分析会执行率均不理想

流程落地存在明显断点

相关会议未留痕,资料未上系统

区域间执行差异显著

北京、新疆、福建等执行率接近100%,浙江、广东等为0

管理缺失问题突出

立项项目为可能+-项目,更需要组织协同推优,现阶段存在管理缺失

下一步要求

1 加强流程执行监督

建立定期检查和通报机制,确保各关键节点按时间要求执行,提升整体执行率

2 统一标准和留痕要求

规范会议记录、资料上传、CRM系统留痕等操作,消除流程断点,实现全流程可追溯

3 建立经验分享机制

促进高执行率区域与低执行率区域的经验交流,缩小区域间差异,提升整体管理水平

核心目标

通过问题分析和针对性改进措施,全面提升MO流程执行率,确保战略项目100%纳入全生命周期管理体系
